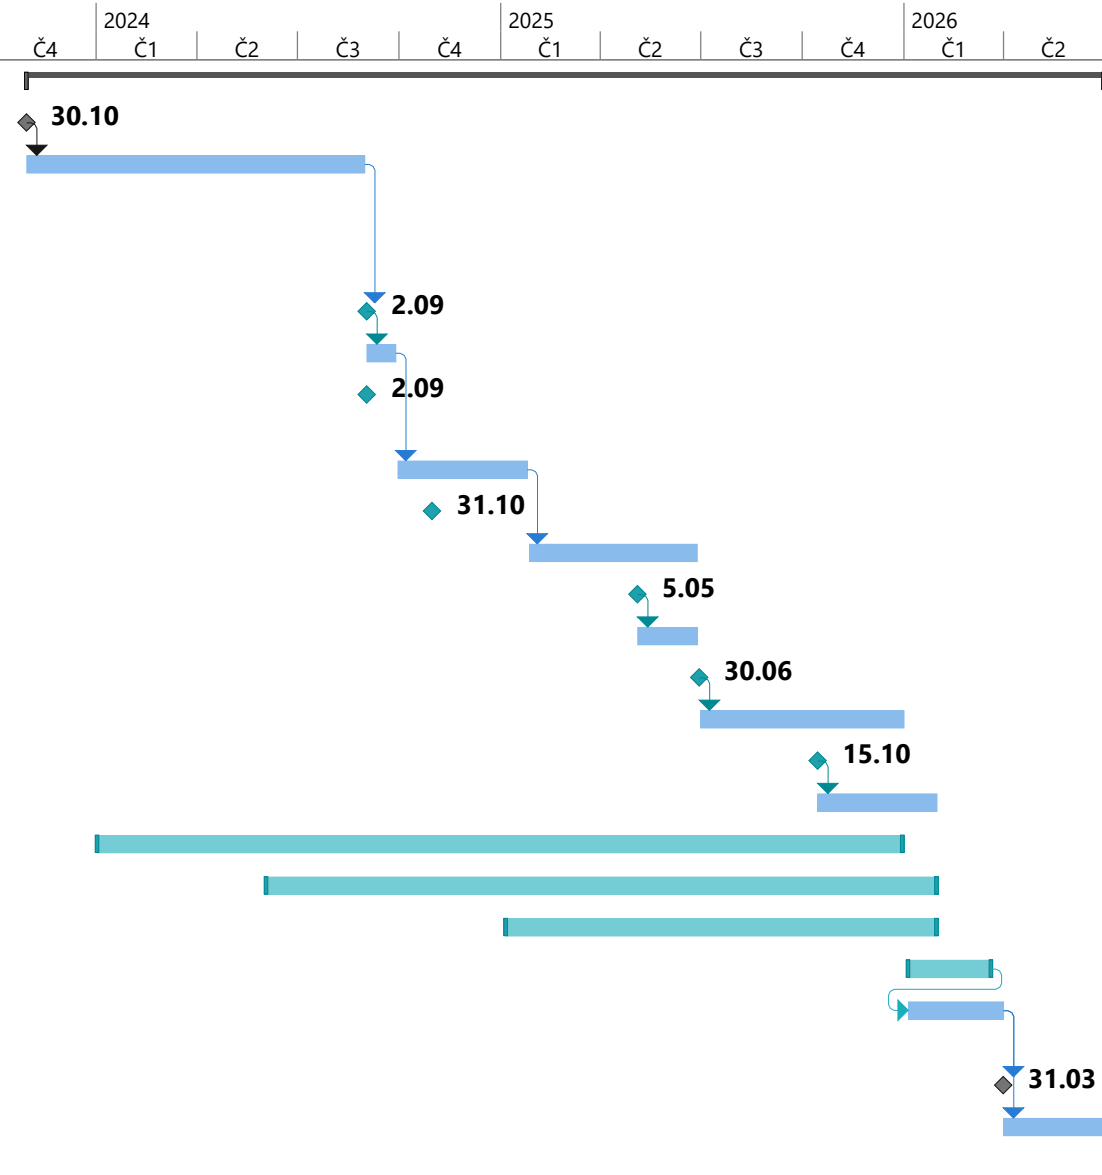


INFORMATIVNI TERMINSKI PLAN (V2)
"ŽELEZNIŠKI IN PREDORSKI SISTEMI NA DRUGEM TIRU DIVAČA - KOPER (SKLOP 3)"

ID	Naičin opravi	Ime opravila	Trajanje	Začetek	Zaključek																		
				Č2	Č3	Č4	2024 Č1	Č2	Č3	Č4	2025 Č1	Č2	Č3	Č4	2026 Č1	Č2	Č3						
1		Izvedba železniških in predorskih sistemov (Sklop 3 - Glavna Dela)	697 dnevi	Pon 30.10.23	Tor 30.06.26																		
2		Podpis pogodbe	0 dnevi	Pon 30.10.23	Pon 30.10.23																		
3		Priprava del od podpisa pogodbe do prve predaje gradbišča (trajanje se glede na datum podpisa Pogodbe poveča ali zmanjša, vendar ne manj kot na 40 delovnih dni) ter izvajanje del, ki jih bo možno izvajati pred predajo gradbišča	220 dnevi	Pon 30.10.23	Pet 30.08.24																		
4		Predaja zemeljskega telesa proge na odseku 2	0 dnevi	Pon 2.09.24	Pon 2.09.24																		
5		Izvedba tira na tirni gredi - Odsek 2	20 dnevi	Pon 2.09.24	Pet 27.09.24																		
6		Predaja predora Dejani (T8) skupa s platojem do (brez) portala T8 Divača	0 dnevi	Pon 2.09.24	Pon 2.09.24																		
7		Izvedba tira na togi podlagi v predoru Dekani - (T8)	85 dnevi	Pon 30.09.24	Pet 24.01.25																		
8		Predaja ostalega dela gradbišča - odsek Črni Kal - Koper (Dekani)	0 dnevi	Čet 31.10.24	Čet 31.10.24																		
9		Izvedba tira na togi podlagi - preostali del -Odsek 2	110 dnevi	Pon 27.01.25	Pet 27.06.25																		
10		Predaja zemeljskega telesa proge na odseku 1	0 dnevi	Pon 5.05.25	Pon 5.05.25																		
11		Izvedba tira na tirni gredi - Odsek 1	40 dnevi	Pon 5.05.25	Pet 27.06.25																		
12		Predaja gradbišča brez vent. Post. - odsek 1 - Divača - Črni Kal	0 dnevi	Pon 30.06.25	Pon 30.06.25																		
13		Izvedba tira na togi podlagi - Odsek 1	132 dnevi	Tor 1.07.25	Sre 31.12.25																		
14		Predaja ventilatorske postaje na portalu T2 Divača	0 dnevi	Sre 15.10.25	Sre 15.10.25																		
15		Izvedba elektro in strojnih del v ventilatorski postaji (TP 2.0)	78 dnevi	Sre 15.10.25	Pet 30.01.26																		
16		Projektiranje in izvedba drugih naprav in sistemov - Odsek 2	521 dnevi	Tor 2.01.24	Tor 30.12.25																		
17		Projektiranje in izvedba drugih naprav in sistemov - Odsek 1	435 dnevi	Pon 3.06.24	Pet 30.01.26																		
18		Gradnja ENP Črni Kal	280 dnevi	Pon 6.01.25	Pet 30.01.26																		
19		Zaključevanje vseh del	55 dnevi	Pon 5.01.26	Pet 20.03.26																		
20		Pregledi pred priklopom nove proge in priklop v omrežje	62 dnevi	Pon 5.01.26	Tor 31.03.26																		
21		Dokončanje del	0 dnevi	Tor 31.03.26	Tor 31.03.26																		
22		Odprava pomanjljivosti, tehnični pregledi upravnih organov, pridobitev dovoljenj	65 dnevi	Sre 1.04.26	Tor 30.06.26																		
23		Predaja v (poskusno) obratovanje	0 dnevi	Tor 30.06.26	Tor 30.06.26																		

Projekt: Terminski Plan Sklop 3 Datum: Tor 28.02.23	Opravo		Povzetek projekta		Ročno opravilo		Le začetek	[Rok	↓
	Razdelitev		Neaktivno opravilo		Le trajanje		Le dokončanje]	Napredovanje	
	Mejnik		Neaktivni mejnik		Zbrani ročni povzetek		Zunanja opravila		Ročno napredovanje	
	Povzetek		Neaktivni povzetek		Ročni povzetek		Zunanji mejnik			
