VARNOSTNI NAČRT ZA GRADBIŠČE

Investitor :	**OBČINA BLED, CESTA SVOBODE 13, 4260 BLED**
Naročnik :	**PROVIA d.o.o., Kranjska cesta 24, 4202 Naklo**
Objekt:	**PARKIRIŠČE POD BLEJSKIM GRADOM**
Vrsta načrta:	**ELABORAT**
Projektivno podjetje:	**PROJEKT VARNOST, d.o.o., Ljubljana**
	Kamniška ulica 25
	1000 Ljubljana
Odgovorni vodja projekta	Matjaž Brezavšček, univ.dipl.inž.grad.
vrsta projekta:	**PZI**
štev. načrta:	**698-VN/2021 verzija 1**
štev. projekta:	**PR500A Provia d.o.o., Naklo**
Datum dokončanja:	**16.08.2021**

Priloga 1B
NASLOVNA STRAN NAČRTA

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje	PARKIRIŠČE POD BLEJSKIM GRADOM
kratek opis gradnje	**Ureditev parkirišča pod Blejskim gradom za osebna vozila, avtodome ter polnjenje električnih vozil s spremljajočimi površinami za pešce in kolesarje ter ureditev novega uvoza in izvoza na parkirišče s priključkom na Rečiško cesto. vrsta gradnje NOVOGRADNJ**
vrste gradnje	☒ **novogradnja – novozgrajen objekt**
	☐ **novogradnja – prizidava**
	☐ **rekonstrukcija**
	☐ **sprememba namembnosti**
	☐ **odstranitev**


DOKUMENTACIJA

vrsta dokumentacije	**PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)**
	☐ **sprememba dokumentacije**

PODATKI O NAČRTU

strokovno področje načrta	**varnostni načrt**
številka načrta	**698-VN/2021 verzija 1**
datum izdelave	**16.08.2021**

PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA

ime in priimek pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja	**Blaž Udovč, dipl. var. inž.**
identifikacijska številka	**172/03-172**
podpis pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja	  PROJEKT VARNOST d.o.o., Ljubljana

PODATKI O PROJEKTANTU

projektant (naziv družbe)	**PROVIA d.o.o.**
naslov	**Kranjska cesta 24, 4202 Naklo**
vodja projekta	**Matjaž Brezavšček, univ.dipl.inž.grad..**
identifikacijska številka	**G-1766**
	podpis vodje projekta
odgovorna oseba projektanta	**Matjaž Brezavšček, univ.dipl.inž.grad.**

podpis odgovorne osebe projektanta


		008.2103.	S.1	

Kazalo:

1. Opis in načrt ureditve gradbišča 5
1.1. Podatki o obstoječih instalacijah 5
1.2. Zavarovanje gradbišča proti okolici 6
1.3. Ureditev pisarn, garderob, sanitarij in nastanitvenih objektov 7
1.4. Ureditev prometnih komunikacij, zasilnih poti in izhodov 8
1.5. Določitev kraja, prostora in načina razmestitve in shranjevanja gradbenega materiala 8
1.6. Ureditev prostorov za hrambo nevarnega materiala 8
1.7. Način prevažanja, razkladanja in nakladanja gradbenega materiala in težkih predmetov 8
1.8. Načini označitve oziroma zavarovanja nevarnih mest in ogroženih področij na gradbišču 9
1.9. Načini dela v neposredni bližini zdravju škodljivih plinov, prahu in hlapov oz. v bližini območij, kjer lahko nastane požar ali eksplozija 9
1.10. Ureditev električnega napajanja gradbiščnih porabnikov 10
1.11. Določitev postavitve gradbenih strojev in naprav ter zavarovanje delovnih območij 11
1.12. Določitev vrst in izvedbe gradbenih odrov 11
1.13. Ukrepi varstva pred požarom 11
1.14. Organizacija prve pomoči 11
1.15. Organizacija prehrane in prevoza delavcev 13
2. Opis tehnologij del 13
3. Seznam nevarnih snovi 14
4. Seznam posebej nevarnih del s predvidenimi varnostnimi ukrepi 14
5. Določitev delovnih mest, na katerih je večja nevarnost za življenje in zdravje delavcev, ter vrste in količine potrebne osebne varovalne opreme; določitev prostorov ali delovišč, kjer veljajo olajšave v zvezi s splošno zahtevo nošenja čelade; 16
6. Smernice za usklajevanje interakcije z industrijskimi aktivnostmi v neposredni bližini gradbišča, tudi z začasno prekinitvijo komunalnih vodov, če je to potrebno; 17
7. Terminski plan - načrtovano zaporedje/istočasnost, roki za izvedbo del; 17
8. Skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu 18
9. Obveznost vodij posameznih del o medsebojnem obveščanju o poteku posameznih faz dela. 19
10. Gradbiščni red (izvleček ukrepov in pravil za zagotovitev varnosti na gradbišču); 20
11. Popis del z oceno stroškov ureditve gradbišča in izvajanja skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja na gradbišču 21
12. POŽARNI RED ZA GRADBIŠČA 22
Zahtevani dokumenti posameznih delodajalcev na gradbišču 23
EVIDENČNI LIST IZVAJALCA 24
SKLEP O IMENOVANJU ODGOVORNEGA VODJE DEL 25

1. Opis in načrt ureditve gradbišča

Po naročilu občine Bled smo prejeli naročilo za izdelavo projektne dokumentacije (IZP, DGD, PZI, IZN) za ureditev cest in parkirišča. Območje ureditve je razdeljeno na območje B in C. Predmet tega projekta PR500A je celotno območje B iz projektne naloge (parkirišče) ter oba nova cestna priključka obstoječe Rečiške ceste (JP 512493) in lokalne ceste LZ 012121 ter dostopne poti do novega parkirišča.
Na območju B je predvidena ureditev 216 PM mest za osebna vozila (199 navadnih parkirnih mest, 6 PM za električna vozila,11 parkirnih mest za invalide) in 15 PM za avtodome ter parkovna ureditev med parkiriščem in Rečiško cesto.

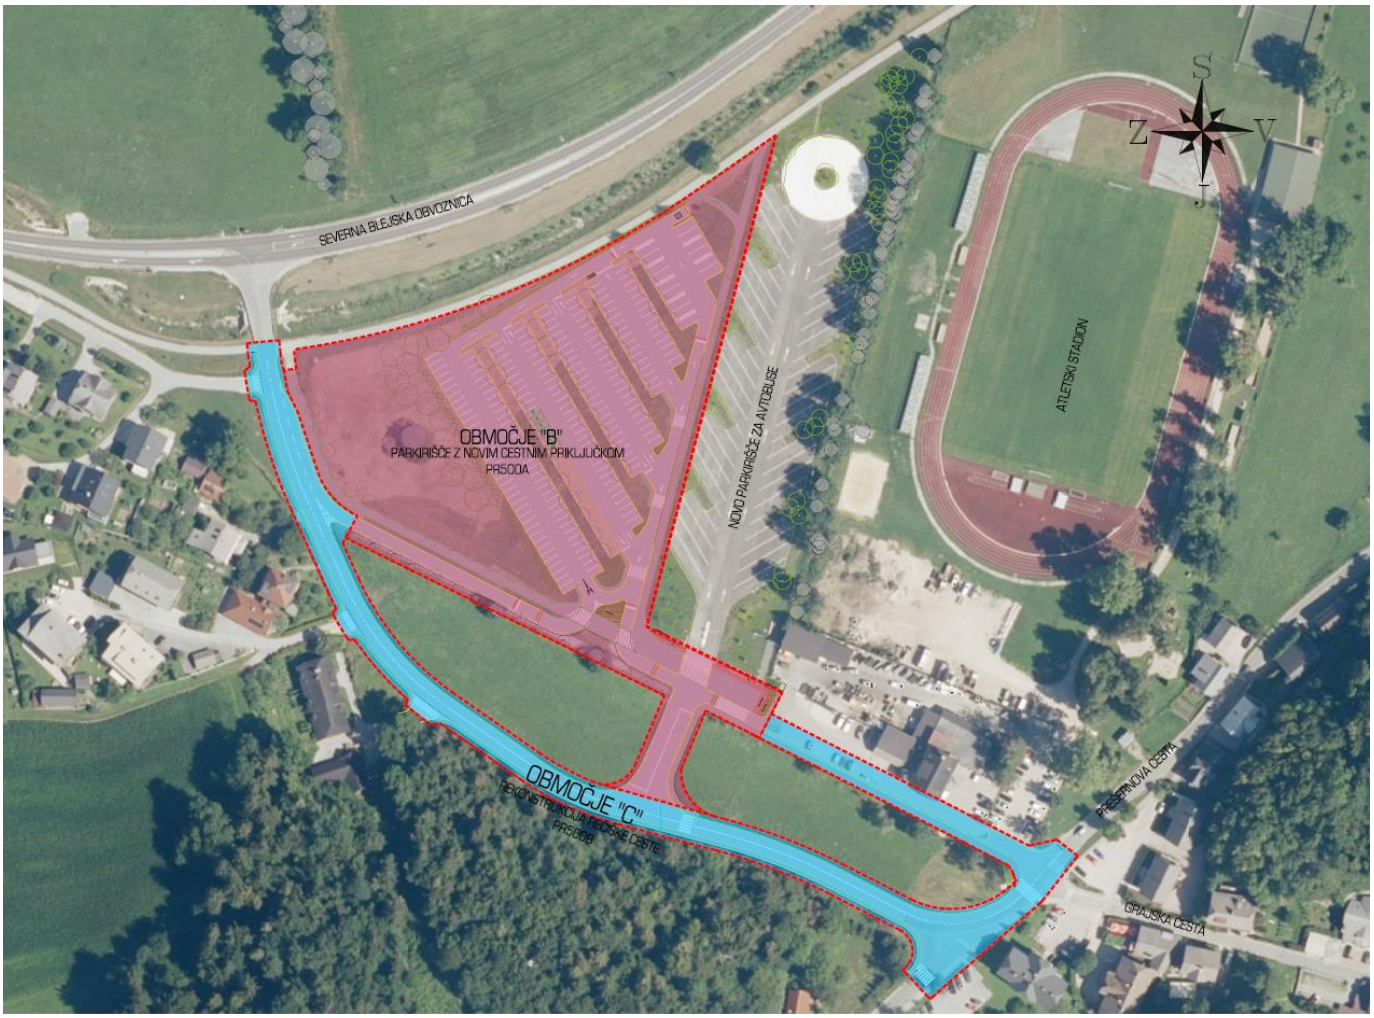

1.1. Podatki o obstoječih instalacijah

Na področju izvajanja del se nahajajo inštalacije, ki ovirajo gradnjo. Ob izvajanju del se obstoječe inštalacije prestavi v skladu z projektom ter ob upoštevanju navodil upravljavca napeljave. Cestna razsvetljava je mejno urejena. Odvodnjavanje je urejeno z meteorno kanalizacijo.

Če med izkopavanjem delavci nepričakovano naletijo na kakršnekoli nepredvidene energetske napeljave (zemeljski energetski kabel, plinovod ….) morajo dela ustaviti in o najdbi obvestiti nadrejene. Vodja gradbišča mora zagotoviti pravilen izklop take napeljave preko ustrezne službe, ki tudi odredi pravilno premestitev najdene inštalacije (po navodilih upravljavca najdene inštalacije).

1.2. Zavarovanje gradbišča proti okolici

Gradbišče se proti okolici zavaruje s prometno signalizacijo in signalnimi trakovi na mestu izvajanja del.

Pri vhodu na gradbišče bo nameščena opozorilna tabla z predpisanimi znaki in vsebino:

- **Z ZNAKI PREPOVEDI:**
  - »VSTOP ZA NEPOOBLAŠČENE JE PREPOVEDAN«,
  - »DOSTOP PEŠCEM JE PREPOVEDAN«
- **Z ZNAKI OBVEZNOSTI**
  - »SPLOŠEN ZNAK ZA OBVEZNOST«
  - »OBVEZNA UPORABA VARNOSTNE ČELADE«
  - »OBVEZNA UPORABA ZAŠČITNIH ČEVLJEV«
  - »OBVEZNA UPORABA DOBRO VIDNIH OBLAČIL«
- **Z OPOZORILNIMI ZNAKI**
  - »POZOR SPLOŠNA NEVARNOST«
  - »NEVARNOST PADCA«
  - »POZOR OVIRE«

Poleg opozorilne table se pri vhodu na gradbišče namesti še:

- požarni red za gradbišče
- gradbiščni red
- kopija prijave gradbišča (samo v primeru, da bo obseg dela večji od 500 človek/dni ali več)

(oblika in vsebina gradbiščne table)
(1) Gradbiščna tabla mora biti pravokotne oblike z merami najmanj 1,0 x 1,5 m, izdelana iz obstojnega materiala in barv. Podlaga table mora biti v svetli barvi, pisava pa v temni, praviloma črni barvi. Velikost črk ne sme biti manjša od 8 cm, pisava pa takšna, da so podatki čitljivi iz razdalje najmanj 15 m.
(2) Na gradbiščni tabli morajo biti po vrsti napisani naslednji podatki:
1. naziv objekta glede na namen, skladno s predpisi, ki urejajo klasifikacijo vrst objektov in vrsta del – nova gradnja, prizidava, nadzidava, rekonstrukcija, sprememba namembnosti, nadomestna gradnja ali odstranitev oziroma rušenje;
2. številka gradbenega dovoljenja oziroma dovoljenj, če jih je bilo več, ter datum izdaje gradbenega dovoljenja in naziv organa, ki ga je izdal, z navedbami morebitnih njegovih sprememb, dopolnitev in podaljšanj;
3. naziv in sedež oziroma ime, priimek in naslov investitorja oziroma investitorjev, če jih je več;
4. naziv in sedež projektanta, ki je izdelal projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja in izdeluje projekt za izvedbo oziroma projektantov, če jih je več;
5. naziv in sedež izvajalca gradnje oziroma izvajalcev, če jih je več;

6. naziv in sedež nadzornika.
(3) Pri gradnji zahtevnega objekta morajo biti na gradbiščni tabli za podatki iz prejšnjega odstavka tudi podatki o nazivu in sedežu revidenta, ki je opravil revizijo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma revidentov, če jih je bilo več, ter ime, priimek in naslov koordinatorja za varnost in zdravje pri delu na gradbišču.
(4) Pri rekonstrukciji objekta, ki je varovan na podlagi predpisov o varstvu kulturne dediščine in pri gradnji na arheološkem območju mora biti na gradbiščni tabli tudi podatek o nazivu in sedežu pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.
(5) Na zgornjem ali spodnjem delu gradbiščne table je lahko označba ali logotip investitorja, lahko pa tudi izvajalca gradnje oziroma izvajalcev del, če se investitor in izvajalci tako dogovorijo. Če se gradnja financira ali sofinancira iz državnega proračuna, občinskega proračuna ali evropskih strukturnih skladov, mora biti na zgornjem delu gradbiščne table nameščen logotip pristojnega državnega organa, občine oziroma Evropskih skupnosti.

1.3. Ureditev pisarn, garderob, sanitarij in nastanitvenih objektov

Za potrebe gradbišča se namesti gradbeni zabojnik kot je prikazano v prilogi tega dokumenta »ureditev gradbišča«. Za sanitarne potrebe se na gradbišču namesti premične kemične sanitarije (označeno v ureditvi gradbišča).
Posamezni izvajalci namestijo kontejner za skladišče drobnega materiala. Opremo za nudenje prve pomoči se namesti v gradbeni kontejner. Stranišče ostane na gradbišču cel čas gradnje Izvajalcem obrtniških del na gradbišču se zagotoviti prostor kamor lahko zaklenejo svoje osebne stvari. Na gradbišču se v bližini garderob namestijo tudi umivalniki (2 kosa). Voda za umivanje se zagotovi z manjšim rezervoarjem za vodo. Namesti se zabojnik za Komunalne odpadke.
Vzdrževanje čistoče v sanitarijah se uredi preko čistilnega servisa. Vsi zgoraj našteti objekti so nameščeni izven območja, kjer se izvaja dela.
Prehrana za delavce se uredi v okoliških gostilnah. Nastanitveni objekti niso predvideni.

1.4. Ureditev prometnih komunikacij, zasilnih poti in izhodov

Gradbišče se na delu, kjer poteka promet uredi v skladu z Elaboratom delne zapore.
Zasilne poti in izhodi niso predvideni.
Smer vožnje po gradbišču je desnosučna.

1.5. Določitev kraja, prostora in načina razmestitve in shranjevanja gradbenega materiala

Lokacije:
Izkopani material za kanalizacijska omrežja se namesti ob izkopu najmanj meter od izkopane jame. Po vgradnji se del izkopanega materiala v kolikor ustreza zahtevam projekta vgradi nazaj. Če material ne ustreza zahtevam projekta se le ta odstrani z gradbišča. Gradbeni material se razmešča glede na potrebe gradnje na različne pozicije na zemljišču . Mesta postavitve deponij gradbenega materiala so označene v organizaciji gradbišča. V kolikor je mogoče se potrebne količine vgrajevanega materiala dnevno dostavlja na mesto vgradnje.

Način razmestitev posameznih objektov je vidna iz načrta »ORGANIZACIJA GRADBIŠČA«.

Vsi materiali morajo biti na deponijah pregledno zloženi po vrsti in velikosti, da ne ovira gibanja ljudi in vozil, višina deponij ne sme biti več kot 2,0 m, deponiranje materiala se bo izvajalo ročno. Gradbene mreže, opažni material, se bodo na objekte nameščali neposredno s transportnih sredstev s kamionskimi žerjavi na mesto gradnje.

1.6. Ureditev prostorov za hrambo nevarnega materiala

Na gradbišču ni predvidenega skladišča za nevarnih snovi.

1.7. Način prevažanja, razkladanja in nakladanja gradbenega materiala in težkih predmetov

Nalaganje izkopanega materiala na kamion bo strojno – nakladač. Gradbeni material na gradbišču bodo kanalizacijske cevi za telekomunikacijo in elektriko. Razkladanje in skladanje materiala se bo izvajalo z dvigalom na tovornjaku, večinoma neposredno na mesto montaže, manjši del se bo prelagal na skladiščne površine, posamezna manjša bremena se bodo s kamionov prelagala ročno.
Za transport betona na gradbišče bodo uporabili tovornjaki.
Za transport odstranjenega materiala se uporablja TGM (težka gradbena mehanizacija).

1.8. Načini označitve oziroma zavarovanja nevarnih mest in ogroženih področij na gradbišču

Celo gradbišče je opredeljeno kot nevarno mesto za možnost padca v globino, padca bremen ali padajočih predmetov v globino. Obstaja možnost zasutja delavca v gradbeni jami. Zato je v območju izvajanja del obvezna uporaba varovalne čelade. Na vhodu na gradbišče bo nameščena opozorilna tabla in napisi za nevarnost, ki mimoidočim prepovedujejo zadrževati se na gradbišču.
Vse delavce se seznani z nevarnimi mesti na gradbišču in pouči o načinu dela na takih mestih.

- Vse izkope, ki so globlji od 1 m se označi s signalno vrvico.

Zaradi dela ob prometu je obvezna uporaba dobro vidnih oblačil za vse delavce na gradbišču.

- Zemeljska dela

<u>Glavne nevarnosti na obravnavanem gradbišču so za delavce, ki izvajajo zemeljska dela:</u>

1. Delo v globini (izkopi)
2. Padci predmetov z višine na delavce (posipanje brežin ter pri nakladanju s TGM)
3. Prah ki nastaja med nalaganjem vozil.

Na dnevnih koordinacijah se je potrebno dogovoriti o delovnih področjih, kjer se ta dan delavci ne smejo nahajati in/ali zadrževati. Na koordinacijskih sestankih naj se opredeli kako se bodo posamezna področja dela na gradbišču označila. Dogovorjeni način označitve naj vodja del predstavi svojim delavcem. (Označitev mora biti skladna s Pravilnikom o varnostnih znakih – Ur. l. RS 39/05). Ročna dela ob stroju je dovoljeno opravljati le takrat, ko stroj miruje.
V času izvajanja zemeljskih del je potrebno preprečiti zadrževanje delavcev drugih izvajalcev na gradbišču na delih gradbišča, kjer bi ta dela lahko poškodovala delavce na gradbišču. Način označitve nevarnih področij naj določi koordinator II. Vsi izkopi, ki so golobji od 1 m in se v njih lahko nahajajo delavci morajo biti izvedeni z zaščitami proti zasipavanju. Za vso gradbeno mehanizacijo je potrebno izvesti ukrepe, ki preprečujejo padec mehanizacije v izkopano jamo. Za ta namen zadostuje signalna vrvica na ustrezni dolžini od izkopa.

1.9. Načini dela v neposredni bližini zdravju škodljivih plinov, prahu in hlapov oz. v bližini območij, kjer lahko nastane požar ali eksplozija

Pri delu z opažnim oljem ali barvami za protikorozijsko zaščito je potrebno dela izvajati v skladu z navodili iz varnostnih listov za posamezno uporabljeno nevarno snov.
Pri delu s takimi snovmi oziroma v bližini teh snovi je prepovedano varjenje, uporaba odprtega ognja ter iskrečega orodja.
Med zarezovanjem asfalta se lahko stalno ali občasno pojavlja prah. Zato je potrebno taka mesta močiti. Ob večjih koncentracijah in dolgotrajnejši izpostavljenosti lahko pride do zdravstvenih težav (silikoza) zato je v času izvajanja rušitvenih del obvezna uporaba osebne varovalne opreme – (respiratorjev oz protiprašnih mask za zaščito dihal).

V primeru uporabe katerekoli nevarne snovi na gradbišču je potrebno uporabljati osebno varovalno opremo, ki jo za to snov predvideva varnostni list.

1.10. Ureditev električnega napajanja gradbiščnih porabnikov

Glavna gradbiščna omarice bo priključena na elektro agregat, za potrebe pisarn in garderobe delavacev.
Gradbiščno omarico se namesti na del gradbišča, kjer bo najmanj ovirala gradnjo. Priključek glavne gradbiščne omarice mora biti izveden za naslednjo priključno moč:

1 x vrtalno kladivo	1,0 kW
1 x vibrator za beton	2,0 kW
drobno električno orodje	2,0 kW
skupaj:	5 kW
faktor istočasnosti	0,75
potrebna moč:	3,75 kW

Električne napeljave smejo izvajati, popravljati, vzdrževati in odstranjevati le strokovno usposobljeni in kvalificirani delavci, ki poznajo nevarnost prisotne pri teh delih.

Proste kabelske vode se od tal dvigne toliko, da ne bo moglo priti do mehanskih poškodb kabla, ali pa ga bomo zaščitili pred mehanskimi poškodbami tako, da ga bomo pokrili oziroma dali v kovinske kanale.

Za vse elektro naprave bo izvedena zaščito proti previsoki napetosti dotika (zaščitna tokovna stikala).

Meritve zaščite proti visoki napetosti dotika (ozemljitvena upornost) bo izvedena pri priklopu. Rezultati meritev se morajo nahajati v pisarni izvajalca.
Proste kabelske vode (samo tipa HO 7 RN –F) se od tal dvigne toliko, da ne bo moglo priti do mehanskih poškodb kabla, ali pa se ga zaščiti pred mehanskimi poškodbami tako, da ga bomo pokrili oziroma dali v kovinske kanale.
Podaljševalni kabli za napajanje električnih premičnih in prenosnih orodij in naprav morajo biti upogljivi in ustrezati standardu SIST HD 22.4, v izvedbi vsaj HO 5 RN – F in primerno mehansko zaščiteni ali postavljeni na ustrezni višini. Na gradbišču se lahko uporabljajo samo kabelski koluti (bobni), ki so opremljeni z vtičnicami pokritimi s pokrovčki proti škropljenju vode, termičnim varovalom proti pregretju kabla in težkim gumi kablom tipa HO 7 RN – F. Pred vsako uporabo kabelskih podaljškov je potrebno opraviti vizualni pregled. Kadar pregledovalec ugotovi vidne poškodbe na izolaciji, uvodnicah, vtiču, vtičnici, termičnem varovalu ali pa če je kabel izpuljen iz vtičnice ali vtiča podaljška ni dovoljeno uporabljati. Krpanje izolacije z izolirnim trakom ni dovoljeno. Na gradbišču je prepovedana uporaba razdelilnih vtičnic. Industrijske trifazne vtičnice morajo biti petpolne, vezava v njih pa desnosučna.
Za vse elektro naprave bo izvedena zaščito proti previsoki napetosti dotika (zaščitna tokovna stikala).
Električna inštalacija in oprema na gradbišču mora ustrezati standardu SIST HD 384.7.704. Zaščita pred vremenskimi vplivi mora biti vsaj razreda IP 43. Fiksne naprave in inštalacija

gradbišča kakor tudi orodja, oprema ter stikala in krmilne naprave pa morajo imeti zaščito pred prašnimi delci in vodo v izvedbi vsaj IP 44.

1.11. Določitev postavitve gradbenih strojev in naprav ter zavarovanje delovnih območij

Stroji, ki se bodo uporabljajo na gradbišču (težka gradbena mehanizacija, nakladač in podobno) se morajo po končanem delu očistiti in zapustiti v skladu z navodili proizvajalca posamezne naprave. Med obratovanjem nakladača - kombinirke je prepovedano gibanje delavcev v delovnem območju stroja, še posebej to velja za približevanje z zadnje strani. Stroj mora biti opremljen z napisi, ki prepovedujejo zadrževanje v delovnem območju stroja. Uporaba teh strojev za prevoz delavcev po gradbišču je prepovedana. Delo s strojem lahko upravlja le za to kvalificiran delavec. Kadar se s strojem ne dela, mora biti le ta zaklenjen.
Ročno orodje, ki se uporablja na gradbišču, mora biti nepoškodovano. Po uporabi se ga shrani v skladiščni prostor.

1.12. Določitev vrst in izvedbe gradbenih odrov

Na gradbišče se ne predvideva uporaba gradbenega odra.

1.13. Ukrepi varstva pred požarom

Delavci se morajo držati določil požarnega reda za gradbišče, ki je sestavni del varnostnega načrta. Požarni red za gradbišče je izobešen na vidnem mestu na gradbišču.
Za potrebe gašenja začetnih požarov na gradbišču se na gradbišče namesti 2 gasilna aparata na prah S6.
Pri rezanju kovinskih elementov, varjenju in ostalih vročih delih je potrebno iz vplivnega območja (do 5 m) odstraniti vse gorljive materiale. Odprtine v bližini izvajanja del (v razdalji do 2 m) je potrebno pokriti. Vroča dela v bližini vnetljivih tekočin so strogo prepovedana. Pri izvajanju vročih del, je potrebno postaviti požarno stražo, ki jo vrši za to določen delavec s strani delodajalca, ki opravlja vroča dela

1.14. Organizacija prve pomoči

Na gradbišču se v objekt, ki ga uporabljajo gradbeni izvajalci za potrebe garderob namesti omarico za prvo. V tem prostoru se tudi izvaja nudenje prve pomoči. Osebe, ki so zadolžene za nudenje prve pomoči (to je ves vodstveni kader + 2 % ostalih zaposlenih) morajo biti usposobljene za nudenje prve pomoči. (osebe za nudenje prve pomoči zagotavlja vsak delodajalec za svoje zaposlene).

OBVEZNA VSEBINA OMARICE ZA PRVO POMOČ

		008.2103.	S.1	

– povoj za prvo pomoč vrste 1	5 kosov
– povoj za prvo pomoč vrste 2	2 kosa
– krep povoj 8 cm x 5 m	5 kosov
– krep povoj 10 cm x 5 m	2 kosa
– povoj iz mula 6 cm x 4 m	5 kosov
– povoj iz mula 10 cm x 4 m	5 kosov
– obliž z blazinico 10 x 4 cm	5 kosov
– obliž z blazinico 10 x 8 cm	5 kosov
– sanitetna vata 100g	1 kos
– trikotna ruta	5 kosov
– lepilni trak 2 cm x 1 m	1 kos
– lepilni trak 2 cm x 5 m	1 kos
– sterilni zloženec 5 x 5 cm –16 sl	5 kosov
– sterilni zloženec 10 x 10 cm	5 kosov
– vpojna sterilna gaza 0,4m¸	1 kos
– vpojna sterilna gaza 0,8m¸	1 kos
– varnostne sponke	5 kosov
– škarje z zaobljeno konico	1 kos
– prvi povoj za opekline (aluplast) kompresa 50 x 60 cm	1 kos
– komprese za opekline (aluplast) 5 x 9 cm	1 škatlica (10 kosov)
– rokavice iz lateksa	5 parov
– priročnik o prvi pomoči	1 kos
– pribor za zapisovanje podatkov o porabljenem materialu	1 kos.

Omarica mora biti vselej v redu. V tako omarico je prepovedano dajati material in predmete, ki se ne štejejo za sanitetni material. Na omarici mora biti navedeno ime osebe, ki je določena za nudenje prve pomoči.

Nudenje prve pomoči na gradbišču obsega:

- čiščenje okolice rane in povijanje
- zaustavitev krvavitev
- umetno dihanje
- ustrezno imobilizacijo
- prevoz v ambulanto ali v bolnišnico (samo pri manjših poškodbah sicer z rešilnim vozilom)

Pomembne telefonske številke:

Nujna medicinska pomoč:	112
Gasilci:	112
Policija:	113
Koordinator VZPD:	
Vodja gradbišča:	
Inšpekcija dela:	01/280-36-70
	01/280-36-61

Koordinatorja mora imenovati naročnik ali nadzornik projekta (v skladu za Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. List RS št 83/05).

1.15. Organizacija prehrane in prevoza delavcev

Posamezni izvajalci bodo hodili na malico v gostilno.
Prevoz delavcev na delovišče je organiziran s strani izvajalskih podjetji.

2. Opis tehnologij del

Za izkop materiala za vgradnjo kanalizacij se uporabi TGM. Pri betoniranju se uporabljajo tovornjak, električni vibrator z visokofrekvenčnim pretvornikom vibratorji. Za opažanje se bo uporabljalo leseni elementi in kovinski podporniki.

Transport gradbenega materiala znotraj gradbišča bo z mini bagerjem.
Za rezanje lesa se bo uporabljala motorna žaga in ročna električna krožna žaga. Pri delu s takim orodjem je potrebno uporabljati OVO (osebno varovalno opremo).

ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK

Parkirišča za avtodome imajo predvidene priklope na elektriko. Na območju parkirišča je predvideno šest parkirnih mest za polnjenje električnih avtomobilov, ki nadomeščajo obstoječa polnilna mesta ob Rečiški cesti.

JAVNA RAZSVETLJAVA

Osvetlitev parkirišč in drugih površin bo minimalna. Uporabljena bodo zasenčena svetila z ravnim in neprodušnim steklom, ki ne oddajajo svetlobe nad vodoravnico. Uporabljene bodo sijalke s poudarjenim rumenim spektrom, ki ne svetijo v UV spektru. Svetilke bodo izbrane iz Kataloga urbane opreme občine Bled.

VODOVODNE INŠTALACIJE

Vsi porabniki vode na območju parkirišča se preko že nameščenega vodomera v novem vodomernem jašku priklopijo na javno vodovodno omrežje.
Razvod se izvede iz cevi PE d20 (DN 15) do PE d50 (DN 40) na globini min. 1,2 m. Za celotno zunanjo instalacijo bo urejena možnost zapiranja vode.
Projekt vodovoda z vodomernim jaškom je bil že obdelan v sklopu projekta avtobusnega postajališča. (NOM BIRO projektiranje in svetovanje d.o.o., št. projekta 8/18-S, Koper 2018).

FEKALNA KANALIZACIJA

Na območju parkirišča za avtodom je predviden izpust sive in rjave fekalne vode. Izpusti bodo speljani v fekalno kanalizacijo, ki poteka čez območje parkirišča.

METEORNA KANALIZACIJA

V sklopu izgradnje parkirišča za avtobuse je bila že izvedena meteorna kanalizacija (PNZ, št. načrta 13-1359, september 2018). Meteorne vode so preko lovilca olj speljane v vodotok Rečica. Sam lovilec olj je bil dimenzioniran tudi za priklop meteorne kanalizacije iz parkirišča za avtomobile. Priklop na obstoječi sistem za odvod meteorne vode na glavnem kanalu M1 pred lovilcem olj. V ta namen je na že izvedeni kanalizaciji (zahodno od obračališča za avtobuse) izvedena slepa cev, ki je namenjena priklopu nove kanalizacije.
komunalnih vodov je potrebno izvajati ročne prekope in izvajati ščitenje vodov.

3. Seznam nevarnih snovi

Na gradbišču se bodo uporabljale naslednje nevarne snovi.

- Opažno olje
- Cement
- Lepila
- Gorivo za orodje z pogonom na notranje izgorevanje

4. Seznam posebej nevarnih del s predvidenimi varnostnimi ukrepi

Posebno nevarna dela na gradbišču bodo:

Gradbiščni promet in mehanizacija

- prometa se izvaja po načrtu ureditve gradbišča,
- nakloni ramp na transportnih poteh ne smejo presegati 12,5 % oz. če je naklon večji je potrebna uporaba takšnih vozil in delovnih sredstev, katera zmorejo premagovati večji naklon,
- delo se izvaja po navodilih za delo s strojem,
- cev črpalke za transport betona držita dva delavca,
- vzvratne vožnje signalizira oz. usmerja delavec,
- prepovedano je zadrževanje delavcev v bližini strojev ali pod visečim bremenom,
- istočasno izvajanje dela na isti lokaciji delavec – stroj ni dovoljeno (ko delavec dela stroj miruje in ko stroj dela se delavec umakne iz manevrskega območja stroja),
- delovni stroji (žerjav, avto dvigalo, gradbeni stroji, tovornjaki, ipd.), se za opravljanje dela locirajo na način, da z nobenim od svojih delov pri izvajanju manevrov ne posegajo izven meja gradbišča.

Glavne nevarnosti na obravnavanem gradbišču so za delavce, ki izvajajo zemeljska dela:

4. Delo v globini (izkopi) - zasutje
5. Padci predmetov z višine na delavce (posipanje brežin ter pri nakladanju s TGM)
6. Prah ki nastaja med nalaganjem vozil.

Na dnevnih koordinacijah se je potrebno dogovoriti o delovnih področjih, kjer se ta dan delavci ne smejo nahajati in/ali zadrževati. Na koordinacijskih sestankih naj se opredeli kako se bodo posamezna področja dela na gradbišču označila. Dogovorjeni način označitve naj vodja del predstavi svojim delavcem. (Označitev mora biti skladna s Pravilnikom o varnostnih znakih – Ur. l. RS 39/05). Ročna dela ob stroju je dovoljeno opravljati le takrat, ko stroj miruje.
V času izvajanja zemeljskih del je potrebno preprečiti zadrževanje delavcev drugih izvajalcev na gradbišču na delih gradbišča, kjer bi ta dela lahko poškodovala delavce na gradbišču. Način označitve nevarnih področij naj določi koordinator II. Vsi izkopi, ki so golobji od 1 m in se v njih lahko nahajajo delavci morajo biti izvedeni z zaščitami proti zasipavanju. Za vso gradbeno mehanizacijo je potrebno izvesti ukrepe, ki preprečujejo padec mehanizacije v izkopano jamo. Za ta namen zadostuje signalna vrvica na ustrezni dolžini od izkopa.

Nevarnosti pri manevriranju z bremeni

- dela se izvajajo po navodilih,
- delo se izvaja pod stalnim neposrednim nadzorom,
- uporablja se osebna varovalna oprema,
- delo in zadrževanje pod visečim in prenašajočimi bremeni ni dovoljeno,
- uravnavanje bremen v zraku se izvaja s pomočjo vrvi,
- breme se lahko uravnava ročno le ko je spuščeno na višino 20 cm od tal,
- pri naravnavanju samega bremena na mesto oz. mesto stika ni dovoljeno prijemanje bremena na koncih kjer pride do stika med posameznima sosednjima bremenoma ali podlago in bremenom,
- uporabljajo se ustrezni pripomočki in sredstva za prenašanje ter nameščanje bremen na pravo mesto,
- poseganje z deli telesa pod že postavljena bremena ni dovoljeno,
- v primeru ročnega premeščanja bremen je potrebno upoštevati psihofizične lastnosti delavca in starost.

Nevarnost elektrike

- napeljava in zaščita gradbiščne elektrike se izvede po načrtu,
- zagotovi se strokovni nadzor nad uporabo in kontrolo gradbiščne elektrike,
- poseganje nekvalificiranih delavcev v električne napeljave na gradbišču ni dovoljeno,
- vse elektro omarice na gradbišču morajo biti vedno zaklenjene,
- obvezna je uporaba fi stikal, katera ne presegajo nazivne vrednosti 30 mA,
- uporaba poškodovanih in na gradbišču popravljenih elektro podaljševalnih kablov ni dovoljena,
- zagotovi se varna vključitev in uporaba podaljševalnih kablov (kabel se najprej razvije in šele nato vključi v gradbiščno elektro omarico),
- poseganje v varnostne razdalje posameznih vodov visoke napetosti ni dovoljeno,
- izvajajo se redni mesečni pregledi elektroinštalacij razpeljanih po gradbišču in polletne meritve ozemljitve ter se o tem vodijo zapisniki,
- elektro vodi, ki bodo na gradbišču razpeljani po višini na lesenih drogovih, morajo biti na sledečih višinah: najmanj 2,5 m nad mestom dela, najmanj 3,5 m nad prehodom za pešce in najmanj 6,0 m nad prehodom za vozila oz. morajo biti vkopani v zemljo.

Nevarnost povezane z uporabo kamionskega hidravličnega dvigala

- za postavitev kamionskega hidravličnega dvigala se preveri nosilnosti tal oz. geomehanska poročila za postavitev na lokaciji v kolikor se ugotovi, da je stabilnost tal vprašljiva,
- preprečiti je potrebno poseg dvigala v gabarit vozišča, da ne pride do trka z vozili v prometnem toku.
- v primeru slabe preglednosti gradbišča se signalizacija izvaja s pomočjo radijske postaje oz. se zagotovi zadostno število signalistov, kateri poznajo osnove signaliziranja,
- za prenos bremen se uporabljajo ustrezne, brezhibne in nepoškodovane navezave ter po potrebi jarmi,
- prenašanje bremen nad sosednjimi objekti in izven meja gradbišča ni dovoljeno,
- zagotoviti je potrebno, da se v maneverskem prostoru dvigala ne nahajajo delavci, ki ne izvajajo dela z dvigalom. Delavci, ki opravljajo delo povezano z dvigalom, pa delo izvajajo na način, da se v nobenem trenutku ne nahajajo pod bremenom ali na lokaciji, na katero bi lahko breme padlo pri postopku montaže.

5. Določitev delovnih mest, na katerih je večja nevarnost za življenje in zdravje delavcev, ter vrste in količine potrebne osebne varovalne opreme; določitev prostorov ali delovišč, kjer veljajo olajšave v zvezi s splošno zahtevo nošenja čelade;

OPIS DELA	NEVARNOST	OSEBNA VAROVALNA OPREMA
Delo ob prometu	Možnost naleta vozil	Delovni čevlji po predpisih Delovna obleka Zaščitne rokavice Varovalna čelada Dobro vidna oblačila.
razopažanje betoniranje, ročni transport	Mehanske nevarnosti	Delovni čevlji po predpisih Delovna obleka Zaščitne rokavice Varovalna čelada
Rušenje, vrtanje (krožna žaga, kotne brusilke)	Odletavajoči delci	Delovni čevlji po predpisih Delovna obleka Zaščitne rokavice Varovalna čelada Zaščitna očala
Rušenje, vrtanje, rezanje (krožna žaga, kotne brusilke)	Hrup Prah	Delovni čevlji po predpisih Delovna obleka Zaščitne rokavice Varovalna čelada Ušesni čepi, glušniki. Delovna obutev, delovna obleka Respirator
Uporaba barv, premazov	Zastrupitve,..	Delovni čevlji po predpisih Delovna obleka Zaščitne rokavice Varovalna čelada Za vsako nevarno snov po varnostnih listih
Obiskovalci	Mehanske nevarnosti	Delovni čevlji po predpisih Delovna obleka Zaščitne rokavice Varovalna čelada Dobro vidna oblačila

Določitev prostorov ali delovišč, kjer veljajo olajšave v zvezi s splošno zahtevo nošenja čelade:
Izvedba zakoličbe, izvajanje čiščenja po končanih delih.

6. Smernice za usklajevanje interakcije z industrijskimi aktivnostmi v neposredni bližini gradbišča, tudi z začasno prekinitvijo komunalnih vodov, če je to potrebno;

Pred izvajanjem del se je potrebno dogovoriti s uporabniki vplivnega območja o načinu obveščanja glede del, ki bi lahko vplivala na uporabnike sosednjih objektov s hrupom, prahom ipd.
Ob izvajanju del, kjer lahko prihaja do prašenja je tega potrebno zmanjševati z močenjem z brizgajočo vodo.

7. Terminski plan - načrtovano zaporedje/istočasnost, roki za izvedbo del;

Terminski plan izdela glavni izvajalec po uskladitvi in v sodelovanju s koordinatorjem II..

8. Skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu

Na gradbišču bodo izvajali dela izvajalci gradbenih in obrtniških del. Za usklajeno delovanje na področju VZPD morajo podpisati Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih ter dela izvajati po navodilih koordinatorja za varnost ter po navodilih za varno delo. Pisni sporazum je v prilogi 1 varnostnega načrta.

Ob ugotovitvi iz terminskega načrta o sočasnosti del je potrebno izvesti skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in sicer:

- Izdelava varnostnega načrta za gradbišče
- Imenovanje koordinatorja na gradbišču v fazi priprave in fazi izvedbe.
- Table o omejitvi vstopa na gradbišče.
- Izvedba ustreznih označitev na gradbišču za nošenje varnostne čelade, prepoved vstopa na gradbišče itd.
- Ograditev gradbišča.
- Ureditev dostopov in poti ter zavarovanja proti okolici
- Nabava ustrezne opreme za nudenje prve pomoči omarica
- Namestitev ustreznega števila gasilnikov na gradbišču
- Opravljanje ustreznih pregledov električne gradbiščne inštalacije
- Priklop elektrike do razdelilnih omaric in vzdrževanje razsvetljave
- Zagotovitev vode za umivanje in pitje na gradbišču.
- Ureditev ustreznih pomožnih prostorov, ki so nujno potrebni (garderobe, sanitarij, skladiščna lopa, pisarna, itd.)
- Namestitev zabojnika za komunalne odpadke in odvoz (odvažal se bo tedensko)
- Ustrezno odstranitev nevarnih in ostalih odpadkov, ki nastanejo pri gradnji (pooblaščena institucija)
- Nastavitev Knjige ukrepov

9. Obveznost vodij posameznih del o medsebojnem obveščanju o poteku posameznih faz dela.

Vodje morajo kot je določeno v terminskem načrtu o začetku del in o svoji prisotnosti in istočasnosti na gradbišču o tem obvestiti koordinatorja za varnost in zdravje. Ugotoviti morajo ali je potrebno pred začetkom del v zvezi z varnostnim načrtom še dodatno izvesti kakšne ukrepe v zvezi s svojim delom, ki niso navedeni v izjavi o varnosti z oceno tveganja pri posameznem izvajalcu.
Vsak vodja del na gradbišču se mora pred začetkom del seznaniti s varnostnim načrtom in o nejasnostih, ki sledijo iz varnostnega načrta ter se o tem pogovoriti i uskladiti s koordinatorjem za varnost in zdravje na gradbišču.
Ob vsakem odstopanju od varnostnega načrta in nezmožnosti izvedbe svojega dela na gradbišču, da izvajalec uskladi s koordinatorjem v fazi izvajanja projekta spremembo varnostnega načrta s stanjem na gradbišču.
Če je ugotovljeno iz terminskega plana, da se določena izvajalska dela ne morejo opravljati istočasno zaradi drugačne izvedbe kot je bilo na začetku predvideno je o tem nujno potrebno obvestiti koordinatorja za varnost in zdravje na gradbišču.
Vsak, ki je na gradbišču o vsaki spremembi iz varnosti in zdravja pri delu obvesti koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.
Vsako pomanjkljivost oz. hujše kršitve v zvezi z neupoštevanjem temeljnih načel iz varnosti in zdravja, ki jo opazi vodja izvajalca enega delodajalca, da teh načel drugi ne spoštuje to zabeleži v knjigo ukrepov za varno delo in o tem obvesti koordinatorja, ki ustrezno ukrepa.

10. Gradbiščni red (izvleček ukrepov in pravil za zagotovitev varnosti na gradbišču);

Cilj uvedbe gradbiščnega reda je, da pri načrtovanju in izvedbi gradbenih projektov izločijo vsa tveganja, ki bi imela za posledico delovno nezgodo. To bomo zagotovili z doslednim spoštovanjem predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva. Za varnost in zdravje pri delu so odgovorni vsi zaposleni na gradbišču, tako delavci, kot tudi predstavniki investitorja in dobavitelji.

Vsi zaposleni in obiskovalci so na gradbišču dolžni upoštevati naslednja določila gradbiščnega reda:

1) Vsi zaposleni in obiskovalci na gradbišču morajo uporabljati zaščitne čelade (razen izjem, ki so navedene v varnostnem načrtu).
2) Delavci na gradbišču morajo uporabljati zaščitna obuvala z varovalno kapico in protivbodnim podplatom.
3) Vsi zaposleni na gradbišču morajo biti teoretično in praktično usposobljeni ter zdravstveno sposobni za delo na gradbišču.
4) Osebe, ki delajo na višini, s katere bi padec lahko povzročil poškodbo, kjer delovno mesto ni zavarovano s predpisano ograjo, morajo nositi varnostni pas. Osebe, na visečih odrih morajo biti pritrjene na posamezne, ločene varovalne vrvi.
5) Vsako okvaro ali nevaren pojav, ki ogroža varnost ali zdravje delavcev, mimoidočih ali obiskovalcev, in ki ga delavec opazi, je dolžan delavec sporočiti nadrejenemu.
6) Pri delih, kjer je ogrožena varnost ostalih zaposlenih, je dolžan izvajalec delovno mesto zavarovati in ga označiti z opozorilnimi napisi.
7) Vroča dela, kot so varjenje in uporaba odprtega ognja se lahko izvajajo le s pisnim dovoljenjem vodje gradbišča po pregledu delovnega mesta in obvezno namestitvijo požarne straže.
8) Odvzem električne energije je dovoljen le iz gradbiščnih električnih razdelilnikov. Na razdelilnike se lahko priključijo samo brezhibni električni vodniki in porabniki.
9) Nevarne in vnetljive snovi se skladiščijo ločeno od ostalih materialov po načrtu organizacije gradbišča in elaboratu varnostnih ukrepov.
10) Uporaba nevarnih snovi je dovoljena izključno po pogojih proizvajalca in navodilih za varno delo ter varnostnih listih. Delo lahko opravijo le za to določene in usposobljene osebe.
11) Lestve morajo biti nameščene tako, da se prepreči njihovo premikanje. Uporaba vrhnjih treh prečk na lestvi je prepovedana.
12) Pred uporabo je obvezen pregled odrov, lestev, orodja in delovnih priprav. Pomanjkljivi predmeti se odstranijo ali popravijo.
13) Uporaba strojev in delovne opreme drugega izvajalca del ni dovoljena.
14) Prepovedano je odstranjevanje varnostnih elementov na sredstvih za delo ali njihova poškodba.
15) Transportne poti morajo biti vedno proste - prepovedano je zalaganje poti z materialom, polaganje električnih vodnikov preko transportnih poti in zalaganje naprav, ki se uporabljajo v sili (električne omarice z varovalkami in stikali, gasilni aparati itd.).
16) Prepovedano je odstranjevanje opozorilnih napisov in oznak (tudi kaznivo po kazenskem zakoniku).
17) Pri delu se smejo uporabljati le brezhibna delovna sredstva, oprema in naprave.
18) Vožnja in parkiranje osebnih avtomobilov na gradbišču ni dovoljena.
19) Delodajalec je ustrezno sankcioniran (izgubi delo na tem gradbišču) če pri njemu zaposlen delavec izvaja ali sodeluje pri izvedbi ene izmed naslednjih aktivnosti:
    a) pitje, uporabljanje, posedovanje, prodaja ali razdeljevanje alkoholnih pijač ali nelegalnih snovi (narkotikov),
    b) zadrževanje na gradbišču pod vplivom alkohola ali narkotikov,
    c) poskus kraje ali kraja lastnine investitorja, izvajalcev ali drugih delavcev,
    d) pretep ali namerno telesno poškodovanje druge osebe,
    e) neposlušnost, grožnje ali ustrahovanje nadrejenih ali sodelavcev,
    f) poškodovanje ali namerno uničevanje lastnine naročnika, izvajalcev ali drugih delavcev,
    g) zavračanje ali zanemarjanje obveznosti v zvezi z varnim in zdravim delom, ki lahko povzroči nezgodo pri delu.

11. Popis del z oceno stroškov ureditve gradbišča in izvajanja skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja na gradbišču

Dejavnost	**STROŠEK**
Ograditev Gradbišča	1300 €
Izvedba ustreznih označitev na gradbišču za nošenje varnostne čelade, prepoved vstopa na gradbišče itd:	200 €
Nabava ustrezne opreme za nudenje prve pomoči omarica	150 €
Namestitev ustreznega števila gasilnikov na gradbišču 2 x S6 na prah	80 €
Opravljanje ustreznih pregledov električne gradbiščne inštalacije	200 €
Priklop elektrike do razdelilnih omaric in vzdrževanje razsvetljave	200 €
Namestitev ustreznih pomožnih prostorov, ki so nujno potrebni (garderobe, sanitarij, skladiščna lopa, pisarna itd.)	1.000 €
Namestitev zabojnika za komunalne odpadke in odvoz	100 €
Namestitev WC - jev in vzdrževanje	200 €
Namestitev čelad za obiskovalce	100 €
Koordinator za varnost	-
	3.530 €

12. POŽARNI RED ZA GRADBIŠČA

I. ORGANIZACIJA VARSTVA PRED POŽAROM

Zaposleni in vsi, ki se nahajajo na gradbišču so dolžni upoštevati in izvajati določila tega požarnega reda, ostalih predpisov, navodil in zahtev varstva pred požarom.
Gosti in obiskovalci so dolžni v primeru izbruha požara upoštevati poleg določil tega požarnega reda tudi navodila zaposlenih ter reševalcev!

II. UKREPI VARSTVA PRED POŽAROM

- Na gradbišču se lahko zadržujejo le zaposleni, obiskovalci in gostje pa le v prisotnosti predstavnika delodajalca – udeleženca pri gradnji in ob odobritvi vodje gradbišča.
- V primeru nastanka oziroma javljanja požara, se naj ravna po strokovnih navodilih oziroma po navodilih požarnega reda za gradbišče.
- Kajenje je na gradbišču dovoljeno le na določenih mestih.
- Na gradbišče se ne sme vnašati in nenamensko uporabljati električnih naprav, grelnih teles, gorljivih materialov in gorljivih snovi.
- **V primeru uporabe odprtega plamena, pri katerem obstaja možnost povzročitve požara, se s strani odgovorne osebe, ki je zadolžena za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, pridobi pisno dovoljenje za delo s predvidenimi ukrepi varstva pred požarom.**
- Za odlaganje gorljivih odpadkov in papirja so nameščene kovinske posode s pokrovom.
- Za gašenje požarov so nameščeni gasilni aparati na vidnih in vedno dostopnih mestih.
- Po končanem delu je potrebno preveriti situacijo na gradbišču in izklopiti vse porabnike električne energije razen tistih, ki so v funkciji stalnega delovanja.
- Vzdrževati se mora red in čistočo.
- Stene objekta ne smejo biti založene z materialom ali gradbeno opremo. Enako velja za hidrante.

V kolikor opazite opuščanje in nepravilnosti pri izvajanju zahtev iz varstva pred požarom, morate o tem takoj obvestiti vodjo gradbišča ali koordinatorja za varnost!

III. NAVODILO ZA RAVNANJE V PRIMERU POŽARA

Kdor opazi, da grozi neposredna nevarnost požara ali eksplozije, oziroma kdor opazi požar, mora nevarnost odstraniti, oziroma požar pogasiti, če to lahko stori brez nevarnosti zase ali druge. Če sam tega ne more storiti, mora takoj obvestiti najbližjo gasilsko enoto, center za obveščanje ali policijsko postajo. Pri tem mu mora pomagati vsak, ki razpolaga s sredstvom za zveze ali prevoznim sredstvom.

V PRIMERU POŽARA POKLIČITE:

GASILCE, REŠEVALCE, CENTER ZA OBVEŠČANJE	**POLICIJO**
112	**113**

Pri javljanju o nastanku požara posreduj naslednje podatke:

- **KJE GORI** (točni podatki o kraju požara)
- **KAJ GORI** (podatki o objektu oz. materialu, ki gori)
- **ALI SO V NEVARNOSTI ČLOVEŠKA ŽIVLJENJA**
- **OBSEG POŽARA**
- **SVOJE IME IN PRIIMEK**

Zahtevani dokumenti posameznih delodajalcev na gradbišču

Z namenom zagotavljanja varnega dela in spoštovanja Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. list RS št.: 83/2005), je potrebno na gradbišče dostaviti: (vsak od izvajalcev na gradbišču)

1. *seznam zaposlenih, ki se bodo nahajali na gradbišču,*
2. *kopijo zapisnika o opravljenem usposabljanju iz varnosti pri delu (za v 1. točki navedene zaposlene),*
3. *kopijo zdravstvenih spričeval (za v 1. točki navedene zaposlene),*
4. *SKLEP O IMENOVANJU ODGOVORNEGA VODJE DEL (Na podlagi 14. člena Gradbenega zakona (Ur. List RS 61/17 in 72/17),*
5. *Podpisati dogovor o skupnih varstvenih ukrepih na delovišču.*
6. *Na 1. koordinaciji morajo posamezni izvajalci določiti vodjo gradbišča (enega izmed vodje del pri posameznem izvajalcu)*

EVIDENČNI LIST IZVAJALCA

Gradbišče:
Izvajalec:
Vrsta del:
Naročnik:
Odgovorni vodja del izvajalca:
Program ukrepov ali navodilo (št.: in datum):
Seznam zaposlenih:

Št:	Priimek in ime (poklic)	Izpit VPD (rok 2 leti)	Zdravstveni pregled (rok omejitve)	Veljavnost delovnega dovoljenja (od – do)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

Datum: žig: podpis: zakoniti zastopnik

Pred začetkom del izpolnjen evidenčni list vročiti odgovornemu vodji gradbišča ali koordinatorju VZD na gradbišču ORIGINAL

SKLEP O IMENOVANJU ODGOVORNEGA VODJE DEL

Delodajalec na gradbišču:

Izvajalec: _____
Naslov:_____

tel:
e-pošta:

Zadeva: SKLEP O IMENOVANJU VODJE DEL

Za gradbišče:_____

Sprejemamo SKLEP O IMENOVANJU VODJE DEL (Na podlagi 14. člena Gradbenega zakona (Ur. List RS 61/17 in 72/17),

Delavca:
_____

Se imenuje za vodjo del.

Datum:

Delodajalec:
