
ID	Task Mode	WBS	Ime opravila	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names
0		**0**	**Terminski plan - Dobava in vgradnja novega mehkega jezu MHE Hrušica**	**443 days**	**Mon 3.02.25**	**Wed 14.10.26**		
1		**1**	**Imenovanje projektne skupine**	0 days	Mon 3.02.25	Mon 3.02.25		
2		**2**	**Izvedba javnega naročila**	**58 days**	**Mon 3.02.25**	**Wed 23.04.25**		
3		2.1	Izdelava dokumentacije za JN	31 days	Mon 3.02.25	Mon 17.03.25	1	Naročnik
4		2.2	Objava JN	1 day	Tue 18.03.25	Tue 18.03.25	3	Naročnik
5		2.3	Priprava ponudb ponudnikov	15 days	Wed 19.03.25	Tue 8.04.25	4	Izvajalec
6		2.4	Odpiranje ponudb	1 day	Wed 9.04.25	Wed 9.04.25	5	Naročnik
7		2.5	Evalvacija pridobljenih ponudb	10 days	Thu 10.04.25	Wed 23.04.25	6	Naročnik
8		**3**	**Izdelava del**	**385 days**	**Wed 23.04.25**	**Wed 14.10.26**		
9		3.1	Podpis pogodbe z izvajalcem	0 days	Wed 23.04.25	Wed 23.04.25	7	Izvajalec;Naročnik
10		**3.2**	**Izdelava nove opreme**	**61 days**	**Thu 24.04.25**	**Thu 17.07.25**		
11		3.2.1	Izdelava nove membrane	60 days	Thu 24.04.25	Wed 16.07.25	9	Izvajalec
12		3.2.2	Izdelava novih pritrdilnih elementov membrane	60 days	Thu 24.04.25	Wed 16.07.25	9	Izvajalec
13		3.2.3	Transport opreme na objekt MHE Hrušica	1 day	Thu 17.07.25	Thu 17.07.25	11;12	Izvajalec
14		**3.3**	**Dela na objektu MHE Hrušica**	**43 days**	**Thu 17.07.25**	**Tue 16.09.25**		
15		3.3.1	Ustavitev elektrarne	0 days	Thu 17.07.25	Thu 17.07.25	13	Naročnik
16		3.3.2	Odpiranje zapornic obtočnega kanala	1 day	Fri 18.07.25	Fri 18.07.25	15	Naročnik
17		3.3.3	Preusmerjanje vode v obtočni kanal	3 days	Mon 21.07.25	Wed 23.07.25	16	Naročnik
18		3.3.4	Postavitev delovnega odra (montažne ploščadi)	5 days	Thu 24.07.25	Wed 30.07.25	17	Izvajalec
19		3.3.5	Čiščenje preliva	3 days	Thu 31.07.25	Mon 4.08.25	18	Izvajalec
20		3.3.6	Demontaža stare membrane	5 days	Tue 5.08.25	Mon 11.08.25	18;19	Izvajalec
21		3.3.7	Čiščenje in sanacija betonske pregrade, protikorozijska zaščita izpostavljenih jeklenih vbetoniranih delov	10 days	Tue 12.08.25	Mon 25.08.25	20	Izvajalec
22		3.3.8	Montaža nove membrane na pregrado	5 days	Tue 26.08.25	Mon 1.09.25	21	Izvajalec
23		3.3.9	Funkcionalni preizkus nove membrane (napihovanje brez vode v prodnem zadrževalniku)	2 days	Tue 2.09.25	Wed 3.09.25	22	Izvajalec
24		3.3.10	Demontaža delovnega odra	3 days	Thu 4.09.25	Mon 8.09.25	23	Izvajalec
25		3.3.11	Preusmeritev vode v prodni zadrževalnik	3 days	Tue 9.09.25	Thu 11.09.25	24;23	Naročnik
26		3.3.12	Zapiranje zapornic obtočnega voda	1 day	Fri 12.09.25	Fri 12.09.25	25	Naročnik
27		3.3.13	Funkcionalni preizkus mehkega jezu	2 days	Mon 15.09.25	Tue 16.09.25	26	Izvajalec
28		3.3.14	Razrez stare membrane	5 days	Tue 12.08.25	Mon 18.08.25	20	Izvajalec
29		**3.4**	**Dokumentacija in ITP**	**21 days**	**Wed 17.09.25**	**Wed 15.10.25**		
30		3.4.1	Izdelava in predaja tehnične dokumentacije	20 days	Wed 17.09.25	Tue 14.10.25	28;27	Izvajalec
31		3.4.2	Interni tehnični pregled	1 day	Wed 15.10.25	Wed 15.10.25	30	Naročnik
32		3.5	Pokusno obratovanje	52 wks	Thu 16.10.25	Wed 14.10.26	31	Naročnik
33		4	Konec projekta	0 days	Wed 14.10.26	Wed 14.10.26	32	

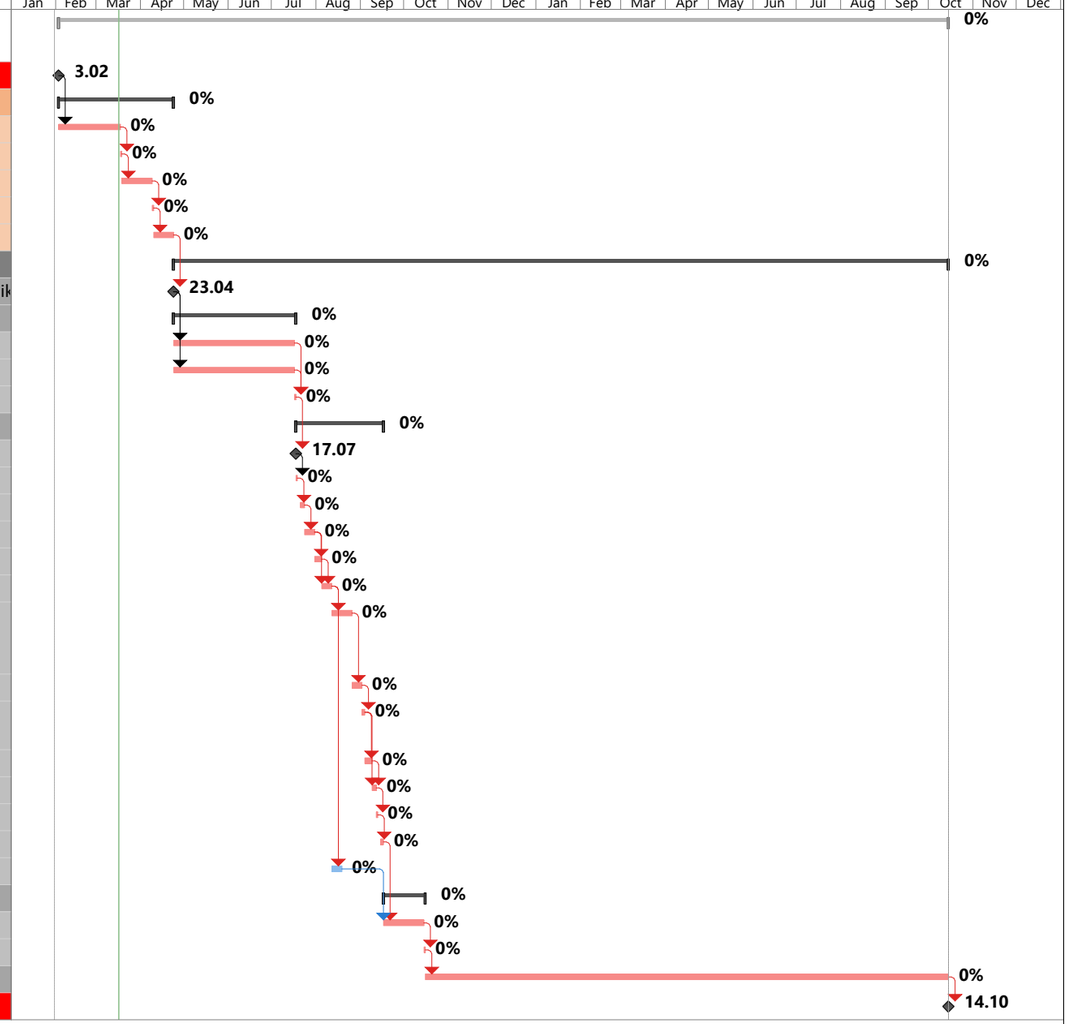

Nujno napredovanje
Opravilo
Razdelitev
Napredovanje opravila
Ročno opravilo
Le začetek
Le dokončanje
Le trajanje
Nujno
Nujna razdelitev
Osnovni načrt
Razdelitev osnovnega načrta
Mejnik osnovnega načrta
Mejnik
Napredovanje povzetka
Povzetek
Ročni povzetek
Povzetek projekta
Zunanja opravila
Zunanji mejnik
Neaktivno opravilo
Neaktivni mejnik
Neaktivni povzetek
Rok
