
110 kV HE Doblar

ID	Ime opravila	Trajanje	Začetek	Zaključek
1	**Rekonstrukcija 110 kV stikališča HE Doblar**	**593 dnevi?**	**Pon 4.11.24**	**Sre 10.02.27**
2	**1. Izbor izvajalca**	**5 dnevi**	**Pon 4.11.24**	**Pet 8.11.24**
3	Podpis pogodbe z izvajalci	5 dnevi	Pon 4.11.24	Pet 8.11.24
4	**2. Izvedba gradnje zgradbe in namestitev opreme**	**511 dnevi?**	**Pet 8.11.24**	**Pon 26.10.26**
5	Prijava pričetka gradnje	0 dnevi	Pet 8.11.24	Pet 8.11.24
6	**Pripravljalna dela**	**11 dnevi**	**Pon 11.11.24**	**Pon 25.11.24**
7	Izdelava varnostnega načrta	10 dnevi	Pon 11.11.24	Pet 22.11.24
8	Uvedba izvajalcev za gradbena dela	1 dan	Pon 25.11.24	Pon 25.11.24
9	Odstranitev KTV kontejnerja	4 dnevi	Pon 11.11.24	Čet 14.11.24
10	**Rušitvena dela in provizorij za požarno vodo**	**60 dnevi**	**Pon 25.11.24**	**Pet 14.02.25**
11	Pred začetkom rušitvenih del postavitev zaščitnih gradbiščnih ograj.	15 dnevi	Pon 25.11.24	Pet 13.12.24
12	Rušenje obstoječe zgradbe na S-V strani HE Doblar (mehanična delavnica, varilnica in pomožni prostori)	10 dnevi	Pon 16.12.24	Pet 27.12.24
13	Delna rušitev betonske ograje okoli 110 kV stikališča	20 dnevi	Pon 16.12.24	Pet 10.01.25
14	Za notranjo izvedbo kabelske trase za HE Doblar 1 rušitev predelnih sten in izvedba preboje	15 dnevi	Pon 13.01.25	Pet 31.01.25
15	Izvedba provizorija za požarno vodo	15 dnevi	Pon 27.01.25	Pet 14.02.25
16	**110 kV GIS stikališče, SM 15A, DEA 500 kVA, KJ2**	**476 dnevi?**	**Pon 30.12.24**	**Pon 26.10.26**
17	Izgradnja zgradbe 110 kV GIS stikališča	275 dnevi	Pon 30.12.24	Pet 16.01.26
18	Izgradnja kabelskega jaška KJ2	20 dnevi	Pon 30.12.24	Pet 24.01.25
19	Izgradnja temelja SM 15 A	10 dnevi	Pon 27.01.25	Pet 7.02.25
20	Gradbena ureditev prostora in montaža DEA 500 kVA.	40 dnevi	Pon 22.12.25	Pet 13.02.26
21	Delna izgradnja jeklene konstrukcije za 110 kV kable za HE Doblar 1	45 dnevi	Pon 10.02.25	Pet 11.04.25
22	Izgradnja DV stebra SM 15A za DV Avče	40 dnevi	Pon 14.04.25	Pet 6.06.25
23	Zgrajen steber na SM 15A	0 dnevi	Pet 6.06.25	Pet 6.06.25
24	Izdelana notranjost zgradbe	0 dnevi	Pet 16.01.26	Pet 16.01.26
25	Uvedba izvajalcev za elektro del	1 dan?	Pon 19.01.26	Pon 19.01.26
26	Montaža lastne rabe	25 dnevi	Tor 20.01.26	Pon 23.02.26
27	Zagon lastne rabe	1 dan	Tor 24.02.26	Tor 24.02.26
28	Montaža GIS postroja	80 dnevi	Pet 15.05.26	Čet 3.09.26
29	Montaža sekundarne in telekomunikacijske opreme	50 dnevi	Tor 7.07.26	Pon 14.09.26
30	Testiranje sekundarne in TK opreme ter GIS opreme	40 dnevi	Tor 1.09.26	Pon 26.10.26
31	**3. Sanacija napušča TR boksov in fasade obstoječe upravne stavbe**	**30 dnevi**	**Pon 19.01.26**	**Pet 27.02.26**
32	Sanacija napušča TR boksov .	20 dnevi	Pon 19.01.26	Pet 13.02.26
33	Sanacija fasade obstoječega objekta upravne stavbe HE Doblar 1	10 dnevi	Pon 16.02.26	Pet 27.02.26
34	Izdelana sanacija TR boksov	0 dnevi	Pet 13.02.26	Pet 13.02.26
35	**4. Izdelava kabelskih razvodov**	**207 dnevi**	**Pon 2.03.26**	**Tor 15.12.26**
36	**Kabelska kanalizacija, 2/3 prekop ceste, KJ1**	**41 dnevi**	**Pon 2.03.26**	**Pon 27.04.26**
37	Prometna zapora državne ceste (polovična zapora ceste, razširitev zapore in preusmeritev preko obstoječe avtobusne postaje v času izvedbe 2/3 prekopa ceste)	1 dan	Pon 2.03.26	Pon 2.03.26
38	Izgradnja kabelskega jaška KJ1	20 dnevi	Tor 3.03.26	Pon 30.03.26
39	Izgradnja cevne kabelske kanalizacija med jaški KJ1 in KJ2 ter do 110 kV GIS stikališča	20 dnevi	Tor 3.03.26	Pon 30.03.26
40	Izgradnja cevne kabelske kanalizacije (izvedba prekopa ceste na širini 2/3 ceste)	20 dnevi	Tor 31.03.26	Pon 27.04.26
41	**Izgradnja kabelske kanalizacije, 1/3 prekop ceste**	**34 dnevi**	**Tor 28.04.26**	**Pet 12.06.26**
42	Prometna zapora in preusmeritev prometa preko začasne obvozne ceste	20 dnevi	Tor 28.04.26	Pon 25.05.26
43	Izgradnja cevne kabelske kanalizacije (izvedba prekopa ceste na širini 1/3 ceste)	10 dnevi	Tor 28.04.26	Pon 11.05.26
44	Izvedba cevne kabelske kanalizacije do SM 15A in SM 15	10 dnevi	Tor 28.04.26	Pon 11.05.26
45	Povrnitev ceste v prvotno stanje	5 dnevi	Tor 12.05.26	Pon 18.05.26
46	Polaganje 110 kV kablov za DV Avče (priključitev na SM 15A in na GIS polje)	15 dnevi	Pon 25.05.26	Pet 12.06.26
47	**110 KV kabelski provizorij**	**22 dnevi**	**Pon 15.06.26**	**Tor 14.07.26**
48	Izgradnja jeklene konstrukcije za vpetja 110 kV kabelskih končnikov za povezavo DV Plave in polje Tolmin	10 dnevi	Pon 15.06.26	Pet 26.06.26
49	Polaganje 110 kV kablov s končniki (cca. 80 m za vsako fazo - preskrbi investitor (ELES)	10 dnevi	Pon 29.06.26	Pet 10.07.26
50	Priključitev 110 kV kablov na DV polje Tolmin.	1 dan	Pon 13.07.26	Pon 13.07.26
51	Priključitev 110 kV kablov na DV vrvi Plave (potreben izklop)	1 dan	Tor 14.07.26	Tor 14.07.26
52	**Kanalizacija za 110 kV DV Plave, HE Doblar 2, hladilno vodo**	**75 dnevi**	**Sre 15.07.26**	**Tor 27.10.26**
53	Delna rušitev aparatov, jeklene konstrukcije in betonskih temeljev za 110 kV DV polje Plave	5 dnevi	Sre 15.07.26	Tor 21.07.26
54	Prestavitev odvodnjavanja hladilne vode za HE Doblar 2	30 dnevi	Sre 22.07.26	Tor 1.09.26



110 kV HE Doblar

ID	Ime opravila	Trajanje	Začetek	Zaključek
55	Izgradnja kabelskega jaška KJ3	5 dnevi	Sre 2.09.26	Tor 8.09.26
56	Izgradnja cevne kabelske kanalizacije od KJ2 do KJ3	30 dnevi	Sre 2.09.26	Tor 13.10.26
57	Izgradnja jeklene konstrukcije za 110 kV kable za DV Plave in HE Doblar 2	5 dnevi	Sre 14.10.26	Tor 20.10.26
58	Polaganje 110 kV kablov za DV Plave in priključitev na GIS polje	10 dnevi	Sre 14.10.26	Tor 27.10.26
59	Izdelan kablovod do HE Doblar 2 in DV Plave	0 dnevi	Tor 27.10.26	Tor 27.10.26
60	**Priključitev HE Doblar 2 in DV Plave, odstranitev provizorija**	**19 dnevi**	**Sre 28.10.26**	**Pon 23.11.26**
61	Delna rušitev aparatov, jeklene konstrukcije in betonskih temeljev za HE Doblar 2 (pogoj odklop HE D2)	10 dnevi	Sre 28.10.26	Tor 10.11.26
62	Izgradnja preostale jeklene konstrukcije za 110 kV kable za HE Doblar 2 (pogoj odklop HE D2)	3 dnevi	Sre 28.10.26	Pet 30.10.26
63	Polaganje 110 kV kablov za HE Doblar 2 in priključitev na GIS polje (pogoj odklop HE D2)	7 dnevi	Sre 28.10.26	Čet 5.11.26
64	Priključitev 110 kV kablov DV Plave na vrvi in GIS stikališče (pogoj odklop HE D2)	8 dnevi	Pon 2.11.26	Sre 11.11.26
65	Testiranje 110 kV kabla DV Plave	2 dnevi	Čet 12.11.26	Pet 13.11.26
66	Testiranje GIS stikališča.	3 dnevi	Pon 16.11.26	Sre 18.11.26
67	Testiranje 110 kV kabla za HE Doblar 2.	3 dnevi	Pon 16.11.26	Sre 18.11.26
68	Priključitev 110 kV kabla HE Doblar 2 na transformator 4BAT	1 dan	Čet 19.11.26	Čet 19.11.26
69	Odstranitev 110 kV kabelskega provizorija med DV Plave in DV polje Tolmin	1 dan	Čet 19.11.26	Čet 19.11.26
70	Sanacija dela transportne poti pred TR za HE Doblar 1	2 dnevi	Pet 20.11.26	Pon 23.11.26
71	Demontaža, montaža, testiranje in spuščanje v pogon nove električne zaščite agregata HE Doblar 2 (pogoj odklop HE D2)	11 dnevi	Sre 28.10.26	Sre 11.11.26
72	Izdelan kablovod do DV Avče in HE Doblar 1	0 dnevi	Čet 19.11.26	Čet 19.11.26
73	**Izvedba priključitve DV Avče in HE Doblar 1**	**18 dnevi**	**Pet 20.11.26**	**Tor 15.12.26**
74	Testiranje 110 kV kabla DV Avče	3 dnevi	Pet 20.11.26	Tor 24.11.26
75	Prestavitev vrvi za DV Avče iz SM 15 na SM 15A	1 dan	Sre 25.11.26	Sre 25.11.26
76	Priključitev kabla na SM 15A za DV Avče	18 dnevi	Pet 20.11.26	Tor 15.12.26
77	Delna rušitev aparatov, jeklene konstrukcije in betonskih temeljev za HE Doblar 1 (pogoj odklop HE D1)	2 dnevi	Čet 26.11.26	Pet 27.11.26
78	Izgradnja preostale jeklene konstrukcije za 110 kV kable za HE Doblar 1 (pogoj odklop HE D1)	5 dnevi	Pet 20.11.26	Čet 26.11.26
79	Polaganje 110 kV kablov HE Doblar 1 in priključitev na GIS (pogoj odklop HE D1)	11 dnevi	Pet 20.11.26	Pet 4.12.26
80	Testiranje 110 kV kablov HE Doblar 1 (pogoj odklop HE D1)	6 dnevi	Pon 7.12.26	Pon 14.12.26
81	Priključitev 110 kV kablov HE Doblar 1 na GIS (pogoj odklop HE D1)	1 dan	Tor 15.12.26	Tor 15.12.26
82	**5. Izgradnja hidrantnega omrežja**	**41 dnevi**	**Sre 28.10.26**	**Sre 23.12.26**
83	Izgradnja cevne kanalizacije za hidrantno omrežje na zunanjem platoju z odcepom v obstoječo zgradbo	20 dnevi	Sre 28.10.26	Tor 24.11.26
84	Postavitev novih hidrantov	5 dnevi	Sre 25.11.26	Tor 1.12.26
85	Priključitev novega hidrantnega omrežja na »T« odcep, kateri je bil v uporabi za provizorij za požarno vodo med izvedbo gradnje	5 dnevi	Čet 10.12.26	Sre 16.12.26
86	Odstranitev provizorija za požarno vodo	5 dnevi	Čet 17.12.26	Sre 23.12.26
87	Zaključitev izgradnje hidrantnega omrežja	0 dnevi	Sre 23.12.26	Sre 23.12.26
88	**6. Končno stanje in zunanja ureditev**	**15 dnevi**	**Sre 16.12.26**	**Tor 5.01.27**
89	Rušitev preostalega 110 kV stikališča	15 dnevi	Sre 16.12.26	Tor 5.01.27
90	Izgradnja ograj, vhodov na plato, zelenice, asfaltne površine itd.	10 dnevi	Sre 16.12.26	Tor 29.12.26
91	**7. Zaključevanje projekta**	**60 dnevi**	**Čet 19.11.26**	**Sre 10.02.27**
92	Pridobitev sprememb v izvedbi del	20 dnevi	Čet 19.11.26	Sre 16.12.26
93	Izdelava PID in ostale dokumentacije za zaključek projekta	30 dnevi	Čet 10.12.26	Sre 20.01.27
94	Tehnični pregled	1 dan	Čet 21.01.27	Čet 21.01.27
95	Zaključna administrativna dela	15 dnevi	Čet 21.01.27	Sre 10.02.27
96				
97				
98				
99				
100				
101				
102				
103				
104				
105				
106				

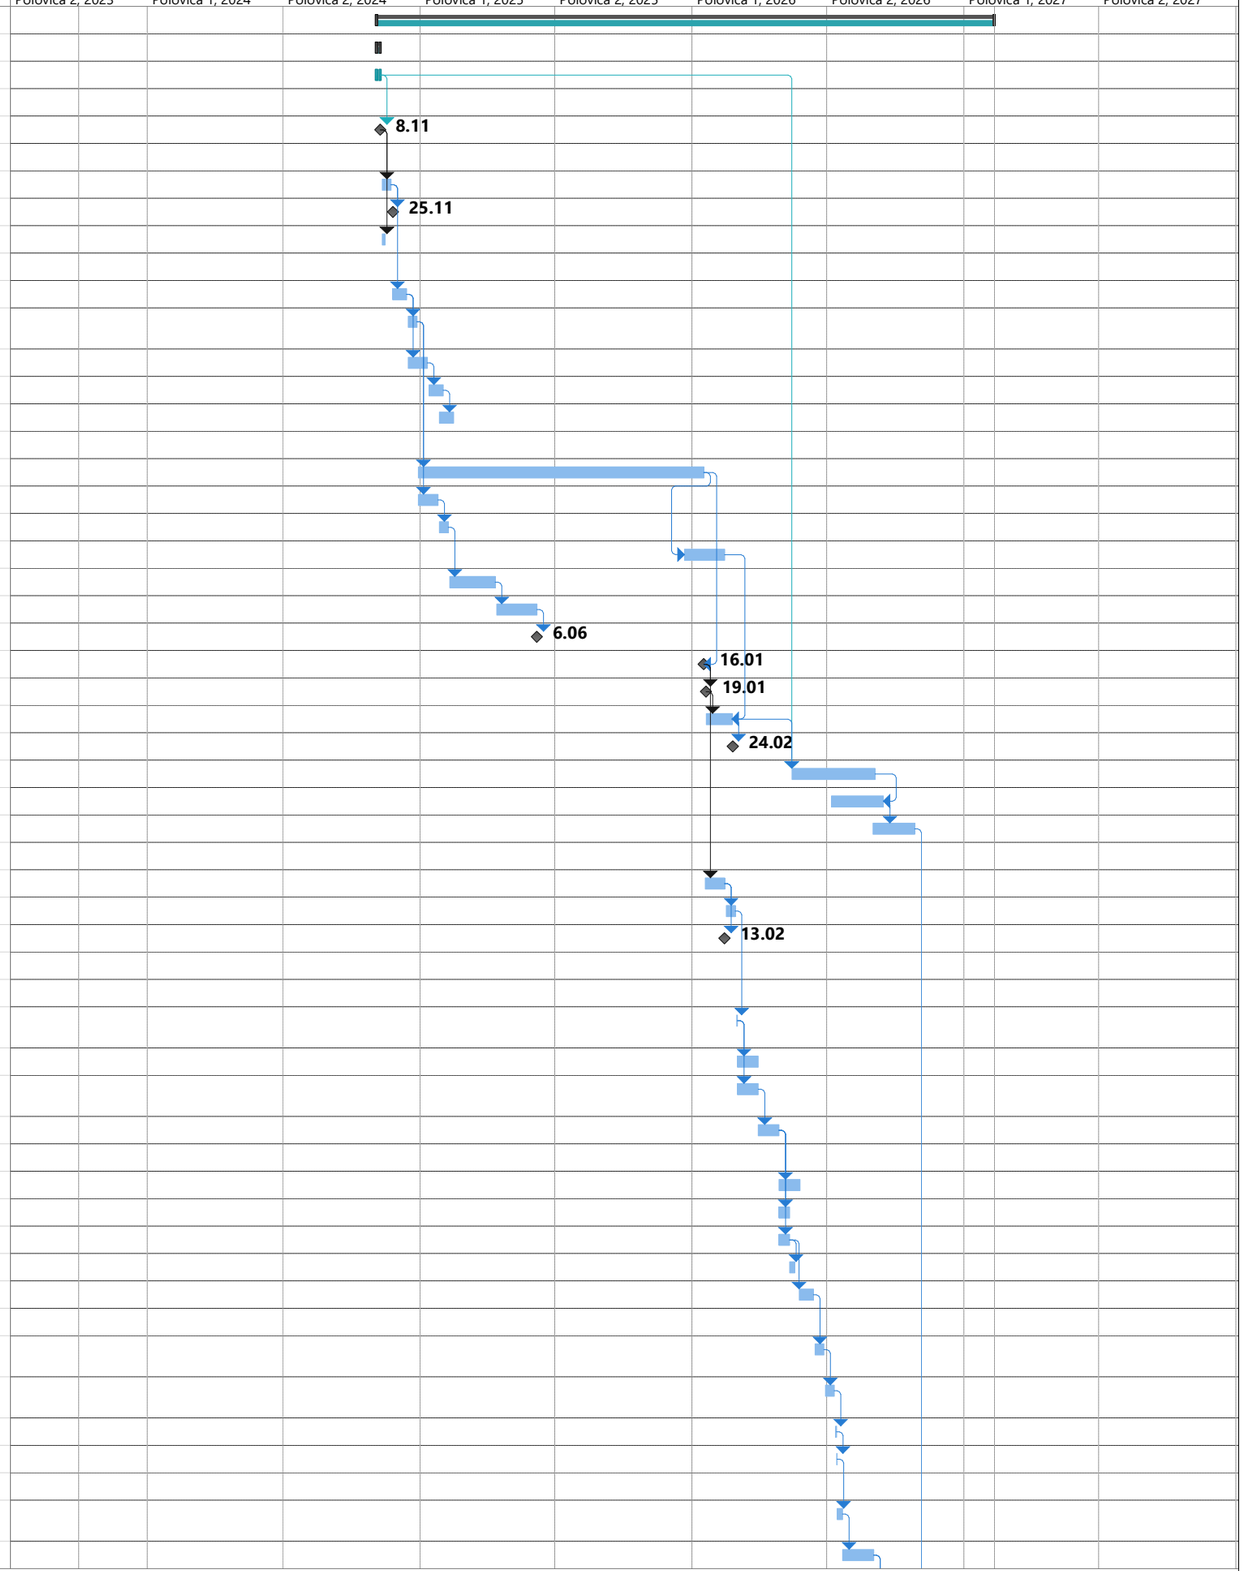
