Projekt: 20-2020 Armaturni načrt - Temeljenje / B001

Projektdaten

Bezeichnung : Armaturni načrt - Temeljenje
Plan Nr. : B001

All total length of bar profiles outer dimension

S T A H L L I S T E Betonstahl: B500A

Pos.	Stk.	d	Länge	D8	D10	D12
1	lfdm	10	1380.00		1380.00	
2	114	10	1.15		131.10	
3	lfdm	8	396.00	396.00		
4	228	8	1.50	342.00		
5	682	10	0.97		661.54	
6	341	10	1.22		416.02	
7	24	10	1.60		38.40	
8	24	12	3.35			80.40
Gesamtlängen				738.00	2627.06	80.40
kg / m				D8 0.395	D10 0.617	D12 0.888
kg / d				291.510	1620.896	71.395

Gesamtgewicht (kg) 1983.801

SOFiSTiK AG - www.sofistik.de

Projekt: 20-2020 Armaturni načrt - Temeljenje / B001

Projektdaten

Bezeichnung : Armaturni načrt - Temeljenje
Plan Nr. : B001

M A T T E N L I S T E Betonstahl: B500A

Pos.	Stk.	Typ	Länge	Breite	R188(A)	R524(A)
1	14	R188(A)-B	2.52	2.30	81.14	
2	15	R524(A)-B	1.75	2.30		60.37
3	15	R524(A)-B	1.00	2.30		34.50
Gesamtflächen					81.14	94.88
kg / m2					2.43	5.49
kg / Mattentyp					197.180	520.864
Gesamtgewicht (kg)		718.044				

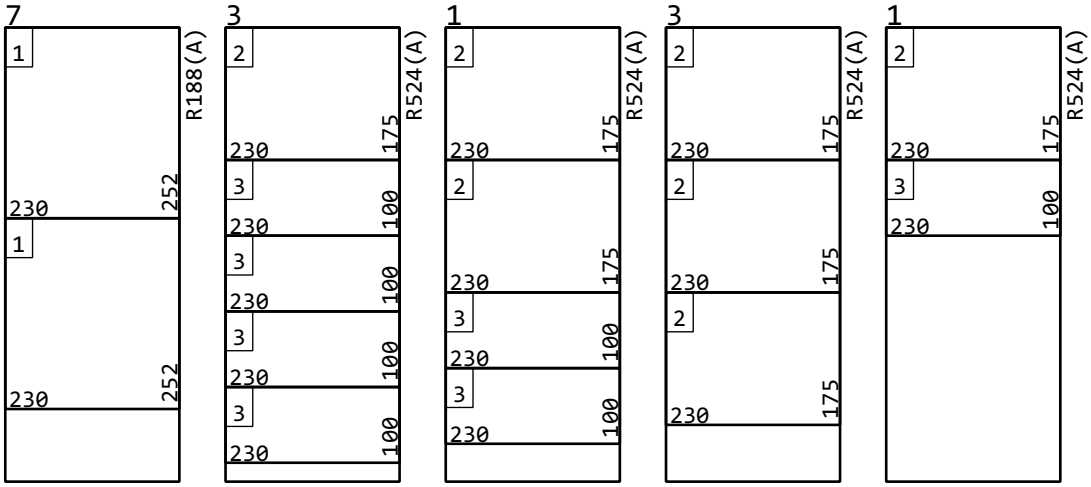
SOFiSTiK AG - www.sofistik.de

Projekt: 20-2020 Armaturni načrt - Temeljenje / B001

Projektdaten

Bezeichnung : Armaturni načrt - Temeljenje
Plan Nr. : B001

M A T T E N S C H N E I D E S K I Z Z E Betonstahl: B500A



Gesamtstahlmenge brutto

Stk.	Typ	Länge m	Breite m	Gewicht kg
7	R188(A)	6.00	2.30	234.738
8	R524(A)	6.00	2.30	606.096
Gesamtgewicht brutto (kg)				840.834







SOFiSTiK AG - www.sofistik.de

Projekt: 20-2020 Armaturni načrt - Temeljenje / B001

Projektdaten

Bezeichnung : Armaturni načrt - Temeljenje
Plan Nr. : B001

B I E G E L I S T E Betonstahl: B500A

Pos.	Stk.	d	Länge	dbr ds	Typ	Biegeform	Ges.L	Gewicht kg
1	lfdm	10	1380.00	4	VE		1380.00	851.460
2	114	10	1.15	4	A3		131.10	80.889
3	lfdm	8	396.00	4	VE		396.00	156.420
4	228	8	1.50	4	A2		342.00	135.090
5	682	10	0.97	4	X1	 Nr. dx dy l >° 1 -0.10 0.00 0.10 90 2 0.00 -0.13 0.13 90 3 0.31 0.00 0.28 117 4 -0.06 0.13 0.12 63 5 -0.24 0.00 0.24 90 6 0.00 -0.10 0.10	661.54	408.170
6	341	10	1.22	4	X1	 Nr. dx dy l >° 1 0.00 -0.08 0.08 90 2 0.45 0.00 0.44 90 3 0.00 0.08 0.08 90 4 -0.44 0.00 0.44 90 5 0.00 -0.08 0.08 90 6 0.10 0.00 0.10	416.02	256.684
7	24	10	1.60	4	A2		38.40	23.693
8	24	12	3.35	4	A3		80.40	71.395

Gesamtgewicht (kg) 1983.801




SOFiSTiK AG - www.sofistik.de

Projekt: 20-2020 Armaturni načrt - Temeljenje / B001

Projektdaten

Bezeichnung : Armaturni načrt - Temeljenje
Plan Nr. : B001

M A T T E N B I E G E L I S T E Betonstahl: B500A

Pos.	Stk.	Matte	Länge	Breite	Typ	Biegeform	Ges.Fl.	Gewicht kg
1	14	R188(A)	2.52	2.30	B2	Winkel 0 Grad  Matte wird um die Querachse gebogen	81.14	197.180
2	15	R524(A)	1.75	2.30	A3	 Matte wird um die Querachse gebogen	60.37	331.459
3	15	R524(A)	1.00	2.30	A1	 Matte wird um die Querachse gebogen	34.50	189.405

Gesamtgewicht (kg) 718.044

SOFiSTiK AG - www.sofistik.de
