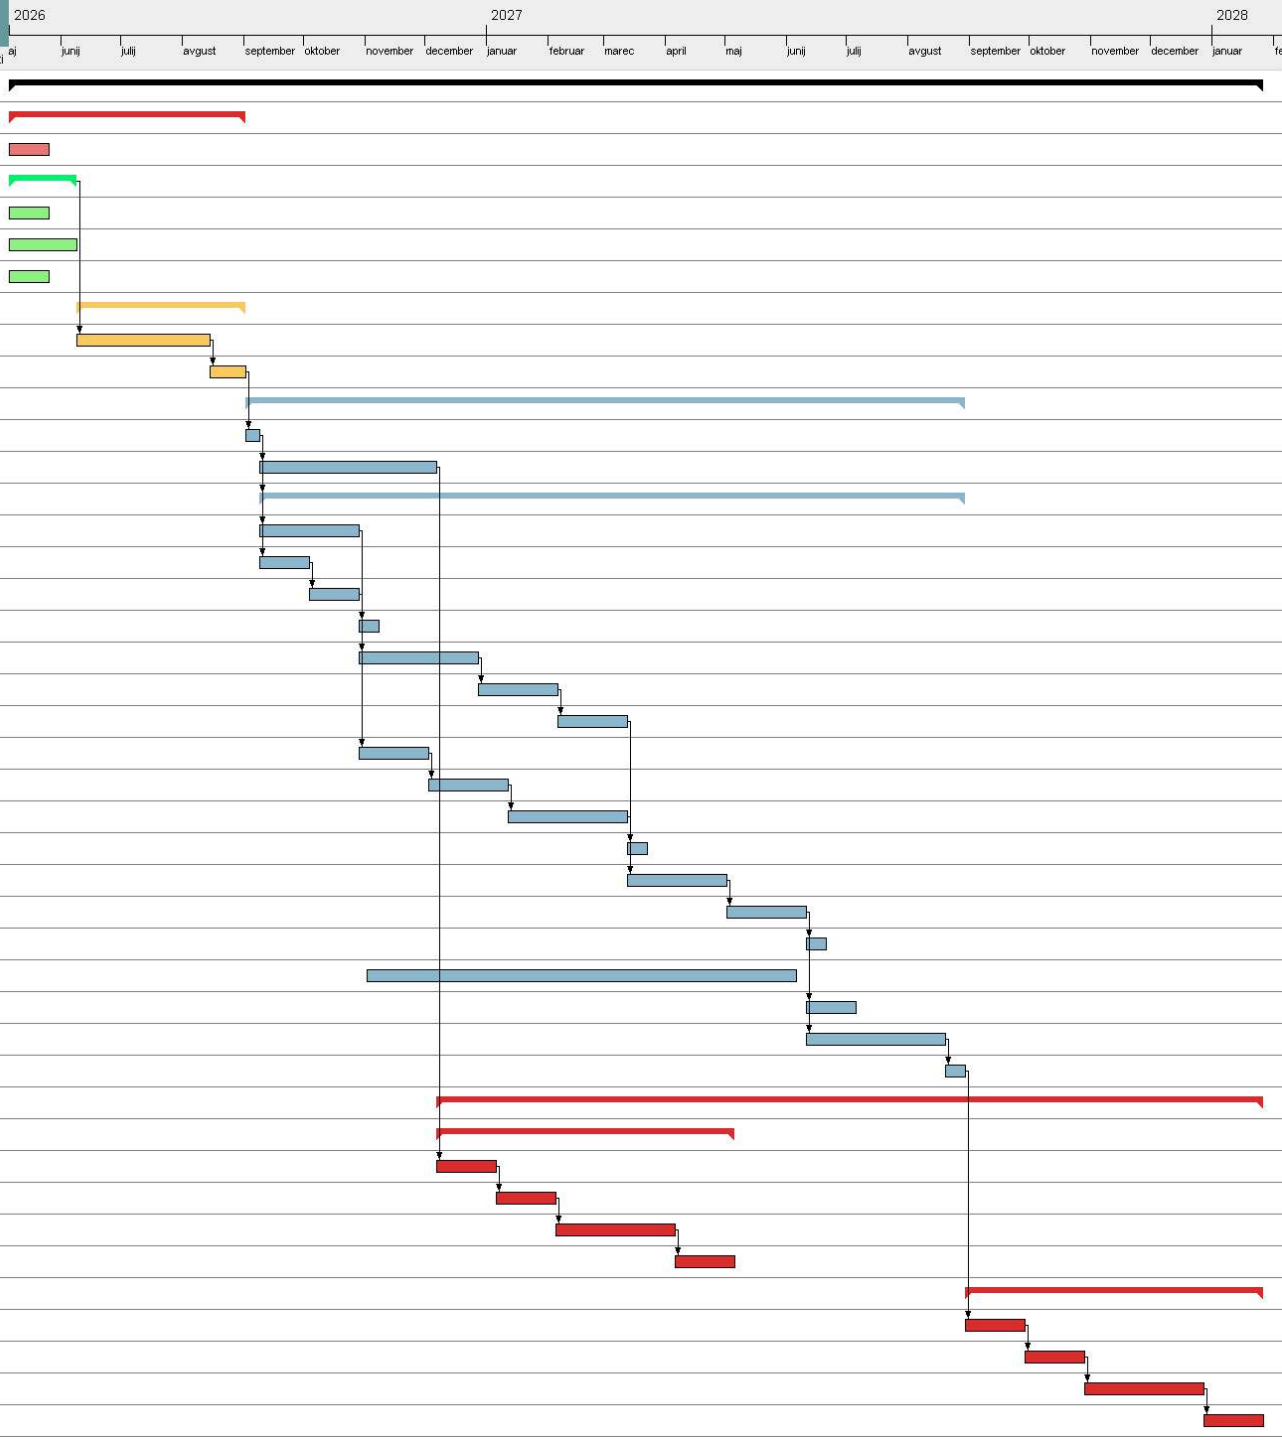Ime	Začetni datum	Končni datum	Trajanje	Predhodniki
ODPRAVA NESOGLASIJ V AGLO > 2.000 PE IN SOČASNA GRADNJA V OBČINI VRHNIKA	6. 05. 26	26. 01. 28	631	
POSTOPKI DO PRIČETKA GRADNJE	6. 05. 26	1. 09. 26	119	
Pridobitev GD	6. 05. 26	25. 05. 26	20	
Projektna dokumentacija	6. 05. 26	8. 06. 26	34	
PZI - 1.FAZA (fekalna kanalizacija Sinja Gorica)	6. 05. 26	25. 05. 26	20	
PZI - 2.FAZA (fekalna kanaliazcije Lesno Brdo)	6. 05. 26	8. 06. 26	34	
PZI - cesta	6. 05. 26	25. 05. 26	20	
Izbira izvajalca	9. 06. 26	1. 09. 26	85	
Piprava in objava javnega naročila	9. 06. 26	14. 08. 26	67	10
Izbor izvajalca	15. 08. 26	1. 09. 26	18	12
GRADNJA	2. 09. 26	29. 08. 27	362	
Uvedba v delo	2. 09. 26	8. 09. 26	7	13
1. FAZA (fekalna kanalizacija Sinja Gorica) s sočasno gradnjo ceste	9. 09. 26	6. 12. 26	89	16
2.FAZA (fekalna kanalizacija Lesno Brdo) s sočasno gradnjo ceste	9. 09. 26	29. 08. 27	355	16
1.DEL	9. 09. 26	28. 10. 26	50	16
9.DEL	9. 09. 26	3. 10. 26	25	16
10.DEL	4. 10. 26	28. 10. 26	25	49
Asfaltiranje ETAPA 1 (1.DEL, 9.DEL, 10.DEL)	29. 10. 26	7. 11. 26	10	50
2.DEL	29. 10. 26	27. 12. 26	60	19
3.DEL	28. 12. 26	5. 02. 27	40	57
4.DEL	6. 02. 27	12. 03. 27	35	33
11.DEL	29. 10. 26	2. 12. 26	35	50
12.DEL	3. 12. 26	11. 01. 27	40	58
13.DEL	12. 01. 27	12. 03. 27	60	35
Asfaltiranje ETAPA 2 (2.DEL, 3.DEL, 4.DEL, 11.DEL, 12.DEL, 13.DEL)	13. 03. 27	22. 03. 27	10	34,52
5.DEL	13. 03. 27	1. 05. 27	50	34
6.DEL	2. 05. 27	10. 06. 27	40	53
Asfaltiranje ETAPA 3 (5.DEL, 6.DEL)	11. 06. 27	20. 06. 27	10	37
Čistilna naprava	2. 11. 26	5. 06. 27	216	
7.DEL	11. 06. 27	5. 07. 27	25	37
8.DEL	11. 06. 27	19. 08. 27	70	37
Asfaltiranje ETAPA 4 (7.DEL, 8.DEL)	20. 08. 27	29. 08. 27	10	56
ZAKLJUČEK PROJEKTA	7. 12. 26	26. 01. 28	416	
1.FAZA (Sinja Gorica)	7. 12. 26	5. 05. 27	150	
Izdelava zaključne dokumentacije (PID, DZO, NOV...)	7. 12. 26	5. 01. 27	30	17
Tehnični pregled	6. 01. 27	4. 02. 27	30	25
Odprava pomanjkljivosti	5. 02. 27	5. 04. 27	60	26
Pridobitev UD in predaja objekta	6. 04. 27	5. 05. 27	30	27
2.FAZA (Lesno Brdo)	30. 08. 27	26. 01. 28	150	
Izdelava zaključne dokumentacije (PID, DZO, NOV,...)	30. 08. 27	28. 09. 27	30	43
Tehnični pregled	29. 09. 27	28. 10. 27	30	29
Odprava pomanjkljivosti	29. 10. 27	27. 12. 27	60	30
Pridobitev UD in predaja objekta	28. 12. 27	26. 01. 28	30	31
